


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1		Impianto cantiere, piste di accesso, ecc.	01/06/2012	16/06/2012	15
2		Sbancamenti, demolizioni rivestimenti spondali, ecc	16/06/2012	01/07/2012	15
3		Realizzazione diaframmi	24/06/2012	22/09/2012	90
4		Costruzione in officina ed approvvigionamento apparecchiature elettromeccaniche	01/08/2012	27/02/2013	210
5		Infissione palancole	20/08/2012	14/09/2012	25
6		Primo scavo tra le palancole, inserimento puntelli e corree	01/09/2012	16/10/2012	45
7		Completamento scavi, costruzione fondazione ed elevazione nuovo manufatto principale	01/10/2012	15/12/2012	75
8		Rimozione palancole, completamento pista di accesso al nuovo manufatto principale	01/12/2012	10/01/2013	40
9		Realizzazione micropali	15/12/2012	03/02/2013	50
10		Realizzazione nuove aperture, rivestimento dei diaframmi e realizzazione imbocchi di monte	10/01/2013	26/03/2013	75
11		Realizzazione manufatto reggitubi e platea di fondazione nuova cabina di trasformazione	10/02/2013	22/03/2013	40
12		Realizzazione plinti e supporti tubazioni	10/02/2013	22/03/2013	40
13		Realizzazione nuova cabina di trasformazione	01/03/2013	31/03/2013	30
14		Ripristino rivestimenti spondali	21/03/2013	25/04/2013	35
15		Posa in opera tubazioni	10/04/2013	15/05/2013	35
16		Realizzazione alloggi per panconcelli	10/05/2013	09/06/2013	30
17		Ripristini sommità arginale, rifacimento pavimentazione stradale	01/06/2013	16/06/2013	15
18		Posa di opere elettriche ed idrauliche	01/06/2013	21/07/2013	50
19		Interventi accessori, rifiniture, ripristini	20/07/2013	09/08/2013	20
20		Messa a punto, prove funzionali impianti	09/08/2013	29/08/2013	20
21		Smobilizzazione cantiere	29/08/2013	13/09/2013	15
24		Fine lavori	13/09/2013	14/09/2013	1

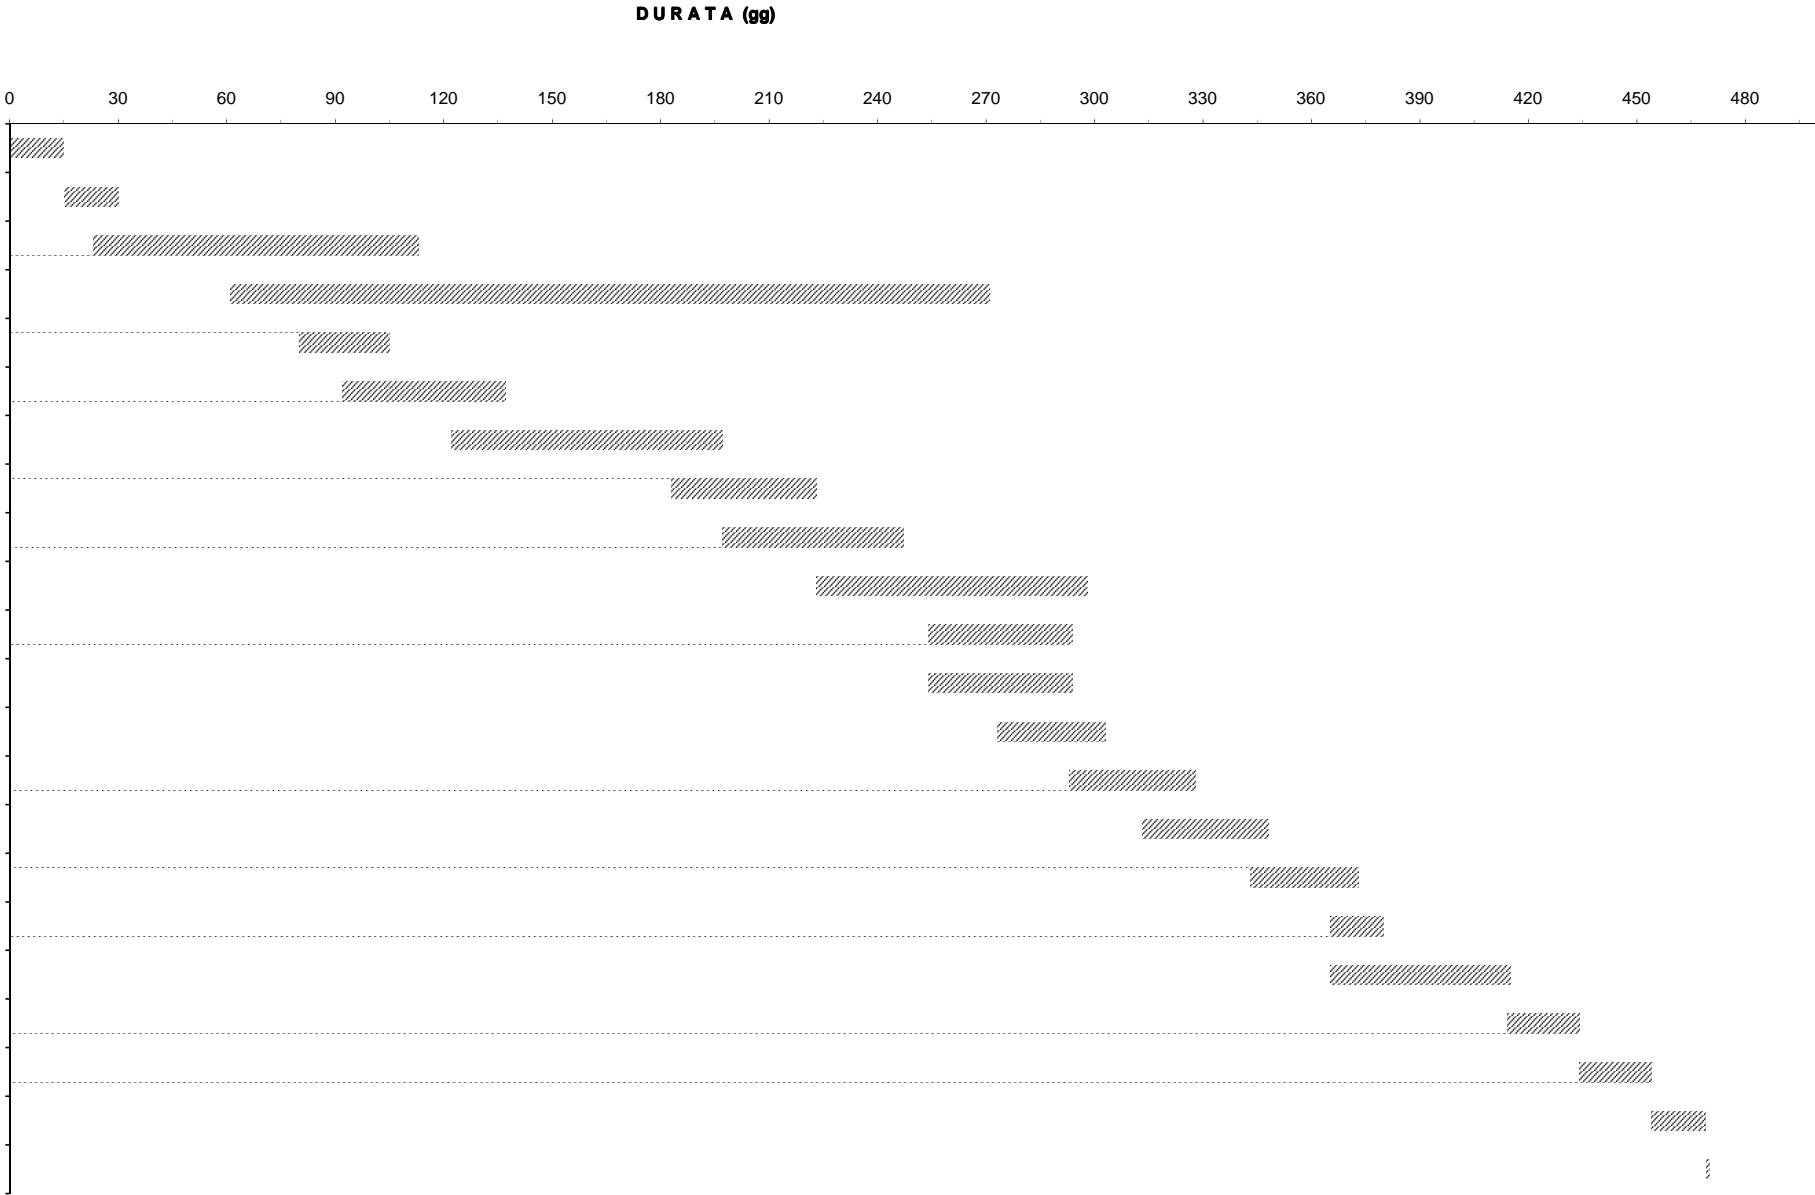

Inizio dei lavori

Fine lavori

0 gg

470 gg

TC

470 gg.
naturali consecutivi
