

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO**AREA NAVIGAZIONE IDROVIE E PORTI**

Via Argine Cisa, 11 - Boretto (RE)
opere idrauliche di 2ª categoria - fiume Po
Legge 18.01.1885 n. 2885

classifica A.I.Po : MN-E-46/NI

Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in Comune di
Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in Comune di Suzzara (MN) - (Foce
Oglio) II LOTTO - cod. Opera 1247
(NI-2019-010)

CUP: B92H18000520002

CIG: 90910560BE

ANNUALITA' 2021-2022**IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 1.000.000,00**

progettazione esecutivo ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e s.mm.ii.

n. perizia

prot.n.

elaborato

titolo elaborato

data

11**CRONOPROGRAMMA LAVORI****25.01.2022**

scala elaborato

REV. DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

A


B

C

D

IL PROGETTISTA:

geom. Fernando ALTOBELLO



Visto: IL R.U.P.

Dott. Luca CROSE

**TECNICI COLLABORATORI:**

Ing. Francesco Zerbini - Ing. Giancarlo Focherini

Geom. Geatana Ruggiero - Geom. Alessandro Ferrari

dott. Paolo Piovani - P.I. Stefano Bugnoli

Verifica per la redazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e succ. mod.

IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO NETTO	INC. % MANODOPERA	INC. MANODOPERA	SQUADRA TIPO	COSTO GIORN. SQUADRA	GIORNATE LAVORATIVE	UOMINI	UOMINI GIORNO
€ 750 750,00	593 478,26	16,473%	97 763,67		801,44	122	3	366

TOT.	366	<200 UG
-------------	------------	---------


OPERAIO	PAGA ORARIA
operaio specializzato	35,23
operaio qualificato	32,84
operaio comune	29,72

	Op. Specializzato	Op. Qualificato	Op. Comune		
squadra tipo	2		1	3	801,44

nota --> importo netto = importo a b.a. depurato del 26,50 % (spese generali + utile impresa)

DURATA
(gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	30/05/2022	30/05/2022	0
2	B	Preparazione cantiere	30/05/2022	03/06/2022	4
3	O.007.01.a	RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO	30/05/2022	14/06/2022	15
4	O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA	04/06/2022	03/08/2022	60
5	O.011.01.a	IMBOTTIMENTO	31/07/2022	22/08/2022	22
6		Oneri sicurezza	30/05/2022	28/08/2022	90
7	C	Fine lavori	25/08/2022	28/08/2022	3

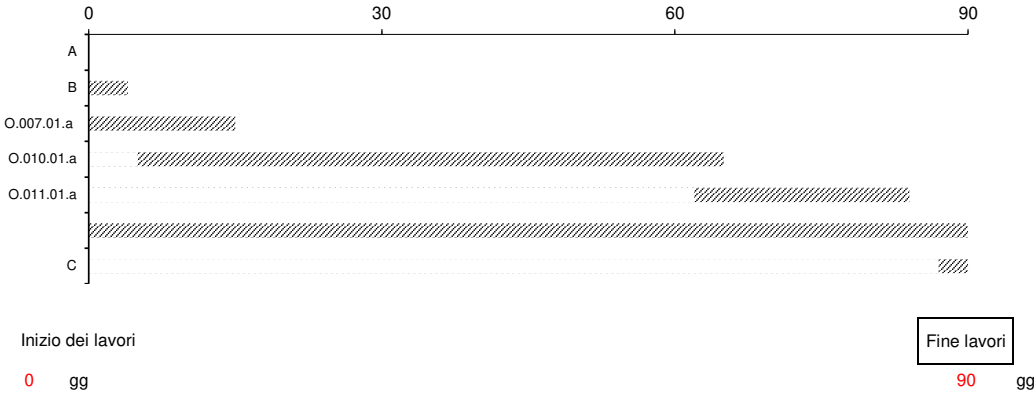

TC

90

gg.

naturali consecutivi
