


(RO-E-1447) – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA DIFESA SPONDALE DELL'ARGINE IN FROLODO IN SINISTRA FIUME PO FRA GLI STANTI 45-47 IN COMUNE DI BERGANTINO (RO).

IMPORTO: € 325.000,00

12. CRONOPROGRAMMA

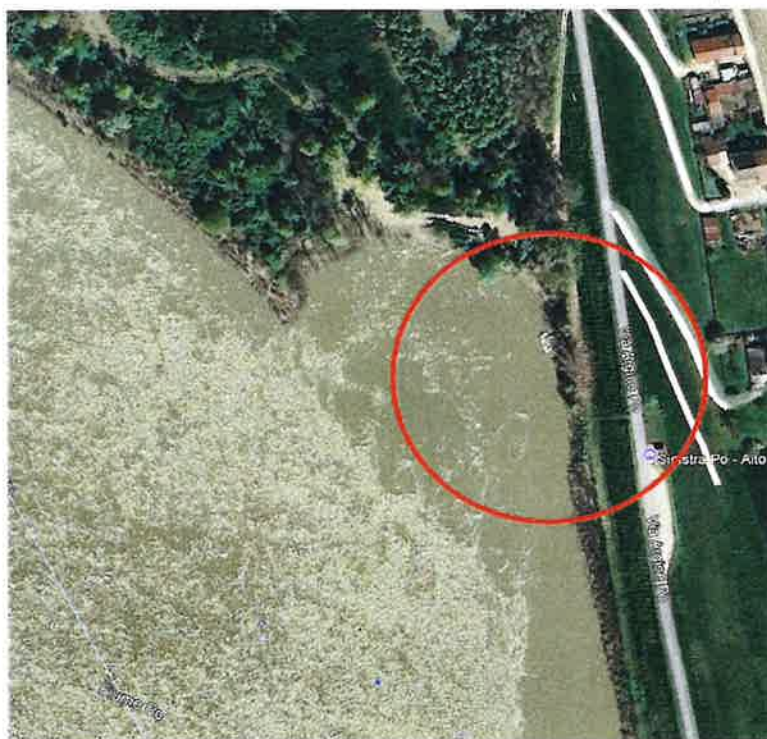

IL PROGETTISTA:

Istr. Idr. Geom. Matteo Occhialini

I COLLABORATORI:

Istr. Tec. Pol. Geom. Alessandro Ferrari



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Ettore Alberani

PERIZIA N. 1622

DATA: 21.07.2025

(RO-E-1447) - LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLA DIFESA SPONDALE DELL'ARGINE IN FROLDI IN SINISTRA FIUME PO FRA GLI STANTI 45-47 IN COMUNE DI BERGANTINO (RO).

Cronoprogramma																				
GIORNI CONTRATTO →	5 (1^)	10 (2^)	15 (3^)	20 (4^)	25 (5^)	30 (6^)	35 (7^)	40 (8^)	45 (8^)	50 (8^)	55 (8^)	60 (8^)	65 (8^)	70 (8^)	75 (8^)	80 (8^)	85 (8^)	90 (8^)	TOTALI PER LAVORAZION I	%
LAVORAZIONI ↓																			IMPORTI	PERCENTU ALI
IMPIANTO DEL CANTIERE	0,00																		0,00	0,00%
ECONOMIE		3.835,30	3.835,31		3.835,31														11.505,92	4,64%
STABILIZZATO			4.225,50																4.222,50	1,70%
RIMANEGGIAME NTO DIFESA				1.703,00															1.703,00	0,69%
FORMAZIONE DI RILEVATO E E POSA GEOTESSILE						6.258,28	6.258,28												12.516,56	5,04%
FORNITURA E POSA PIETRAME								20.942,07	20.942,07	20.942,07	20.942,07	20.942,07	20.942,08	20.942,08	20.942,08	20.942,08	20.942,08		209.420,75	84,36%
ONERI DI SICUREZZA	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,43	492,44	492,44	492,44	492,44	492,44	492,44	492,44	8.863,81	3,57%
SMOBILIZZO DEL CANTIERE																		0,00	0,00	0,00%
TOTALI PER PERI	492,43	4.327,73	8.553,24	2.195,43	4.327,74	6.750,71	6.750,71	21.434,50	21.434,50	21.434,50	21.434,50	21.434,51	21.434,52	21.434,52	21.434,52	21.434,52	21.434,52	492,44	248.235,54	100,00%
% PARZIALE	0,20%	1,74%	3,45%	0,88%	1,74%	2,72%	2,72%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,20%	248.232,54	100,00%
% PROGRESSIVA	0,20%	1,94%	5,39%	6,27%	8,01%	10,73%	13,45%	22,09%	30,73%	39,37%	48,01%	56,65%	65,28%	73,91%	82,54%	91,17%	99,80%	100,00%	248.232,54	100,00%
