


DIAGRAMMA DI GANTT

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	18/01/2010	18/01/2010	0
2	B	Preparazione cantiere	18/01/2010	20/01/2010	2
3	105	TAGLIO - RIMOZIONE -SISTEMAZIONE VEGETAZIONE	20/01/2010	20/04/2010	90
3	106	SCAVI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	28/01/2010	18/05/2010	110
3	108	RILEVATI ARGINALI - RISARCIMENTO - OPERE IN PIETrame	09/02/2010	10/04/2010	60
3	110	OPERE INGEGNERIA NATURALISTICA	10/06/2010	25/06/2010	15
3	115	CONGLOMERATI CEMENTIZI - FERRO PER C.A. - MANUFATTI IN CLS	12/05/2010	16/06/2010	35
3	116	OPERE IN PIETRA DA TAGLIO	15/03/2010	19/04/2010	35
3	118	OPERE IN METALLO	22/04/2010	29/04/2010	7
3	S	ONERI SICUREZZA	18/01/2010	17/07/2010	180
8	H	Fine lavori	17/07/2010	17/07/2010	0

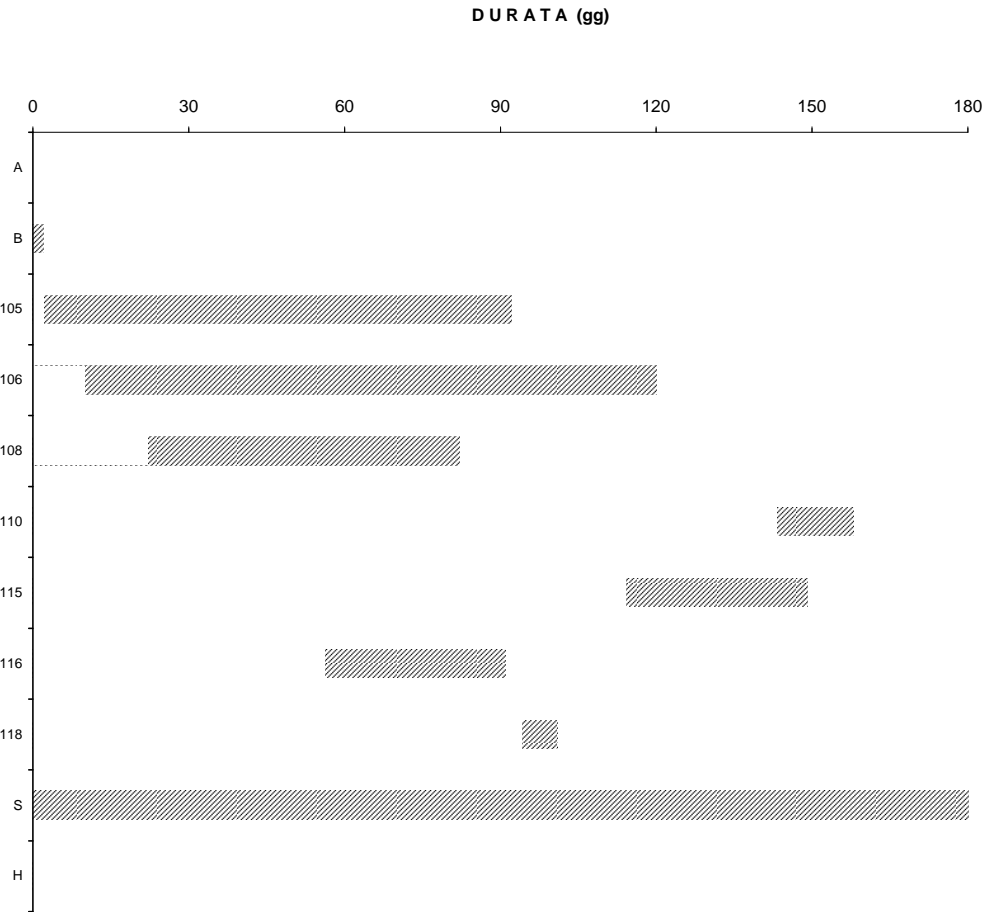

Inizio dei lavori

0 gg

Fine lavori

180 gg

TC

180

gg.

naturali consecutivi
