

ALLEGATO "A"

Comune di Como e Tavernerio
Provincia di di COMO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI DISBOSCAMENTO, SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO E
MANUTENZIONE DELLE OO.II. DI 3^a CAT. IN TRATTI SALTUARI DEL TORRENTE
COSIA
NEI COMUNI DI COMO E TAVERNERIO.

COMMITTENTE: AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.Po – PARMA -

CANTIERE: Lungo l'asta del torrente Cosia nei comuni di Como e Tavernerio


Busto Arsizio, 03/11/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Roberto Flavio)


per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
(\$Empty_COM_11\$ \$Empty_COM_10\$ \$Empty_COM_09\$)

Ingegnere Roberto Flavio
Via Avv. Camillo Tosi
21052 Busto Arsizio (VA)
320/8603178 - -

Nome attività	Durata	Settimana -1										Settimana 1											
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7			
Lavori torrente Cosia	112 g																						
Preparazione Cantiere	2 g																						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z1																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			Z1																			
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g			Z1																			
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g				Z1																		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g				Z1																		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g				Z1																		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g				Z1																		
Taglio-Rimozione-Sistemazione Vegetazione	63 g																						
Taglio- Rimozione- Sistemazione vegetazione	63 g																						
Disboscamento e taglio vegetazione	63 g																						
Scavi, Demolizioni, Rimozioni	77 g																						
Scavo di sbancamento	77 g																						
Rilevati Arginali, Risarcimento, Opere in Pietrame	43 g																						
Rilevati arginali, Risarcimento, Opere in pietrame	43 g																						
Opere Ingegneria Naturalistica	11 g																						
Rinverdimento di difesa spondale	11 g																						
Conglomerati Cementizi-Ferro per C.A.-Manufatti In C.L.S	24 g																						
Conglomerati cementizi- Ferro per C.A.-Manufatti in cls	24 g																						
Opere In pietra da Taglio	25 g																						
Posa di rivestimenti esterni	25 g																						
Opere in Metallo	6 g																						
Posa di ringhiere e parapetti	6 g																						
LEGENDA Zona:																							
Z1 = ZONA UNICA																							

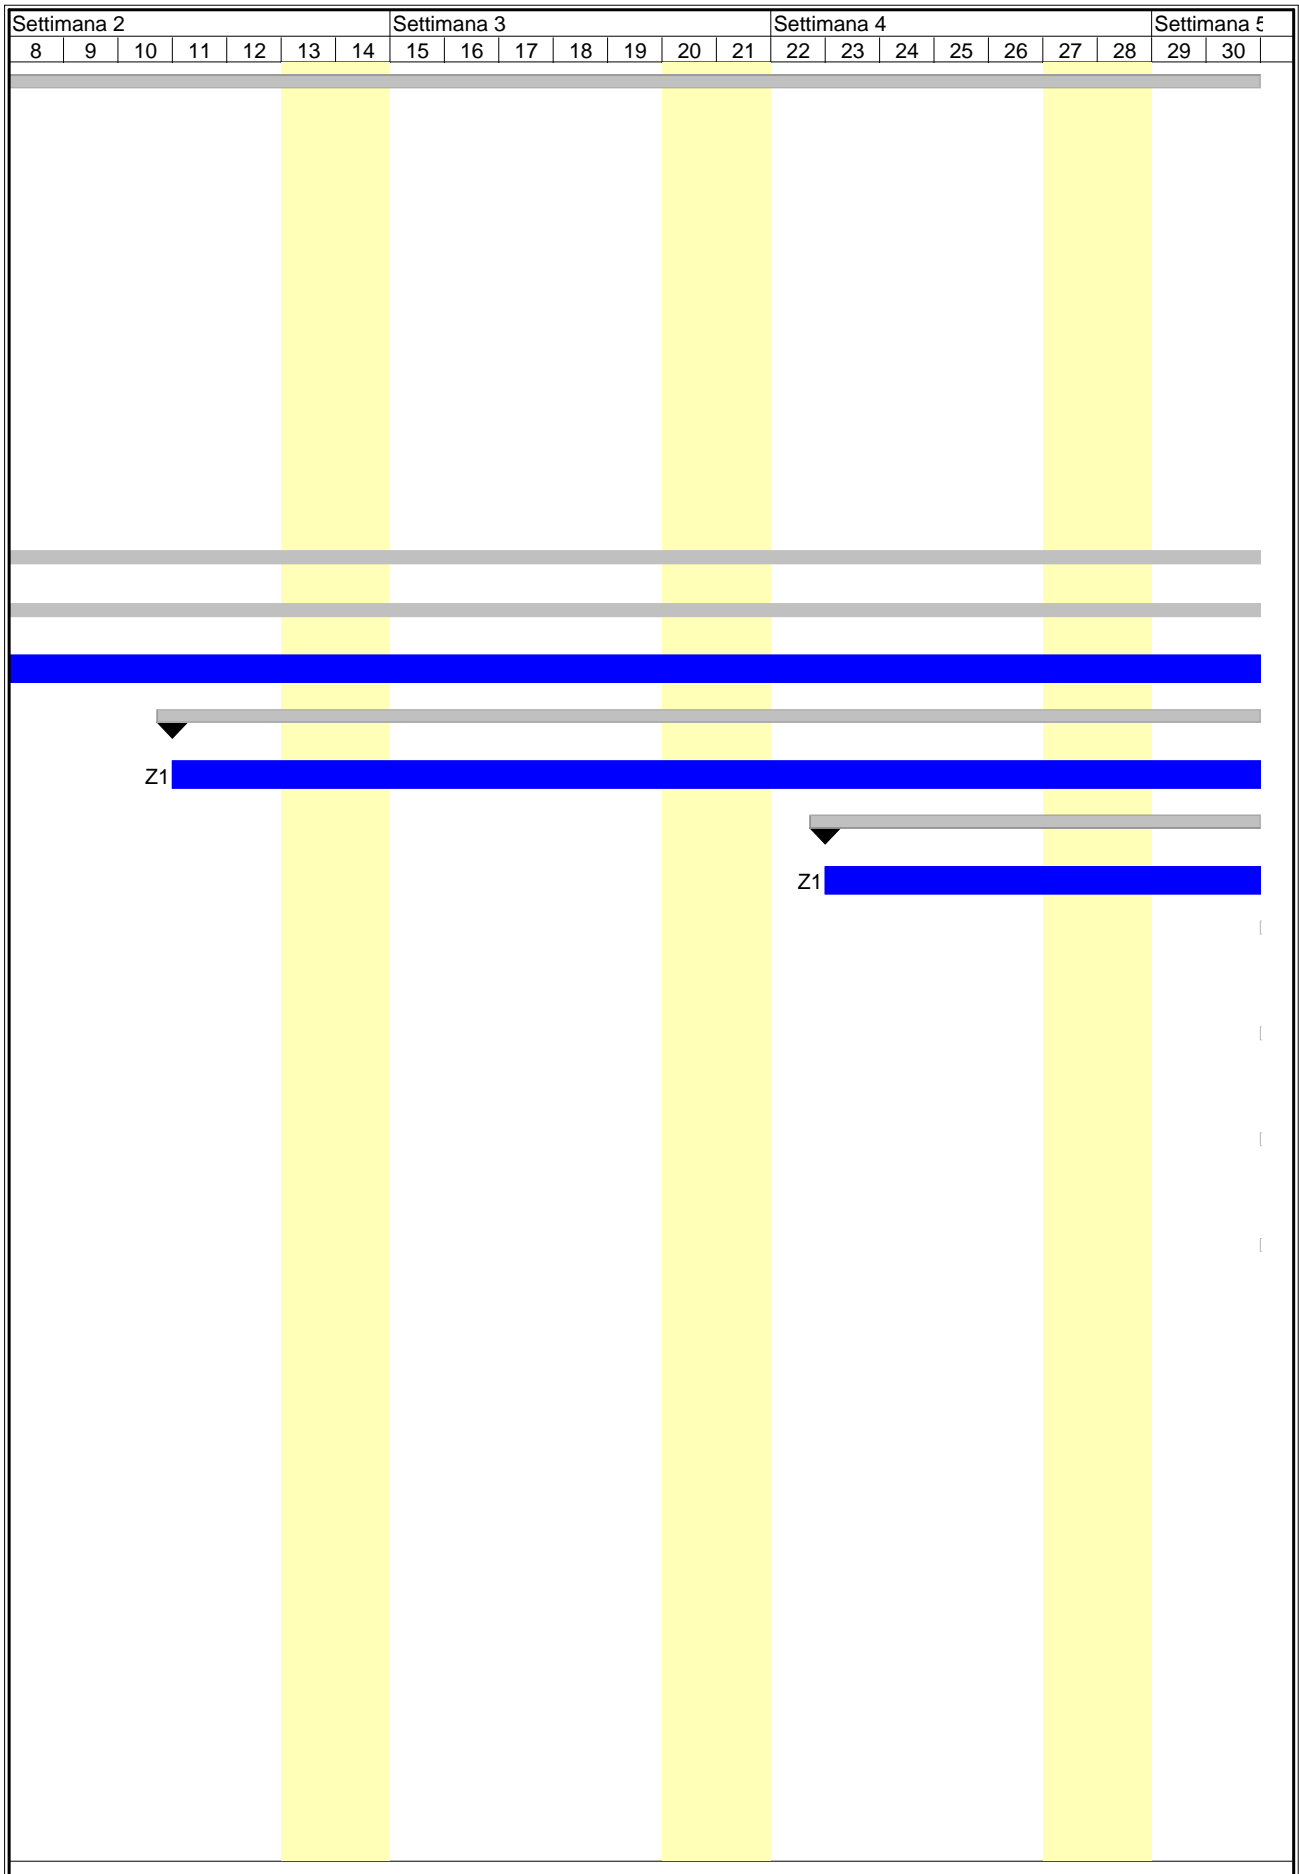

[illegible]

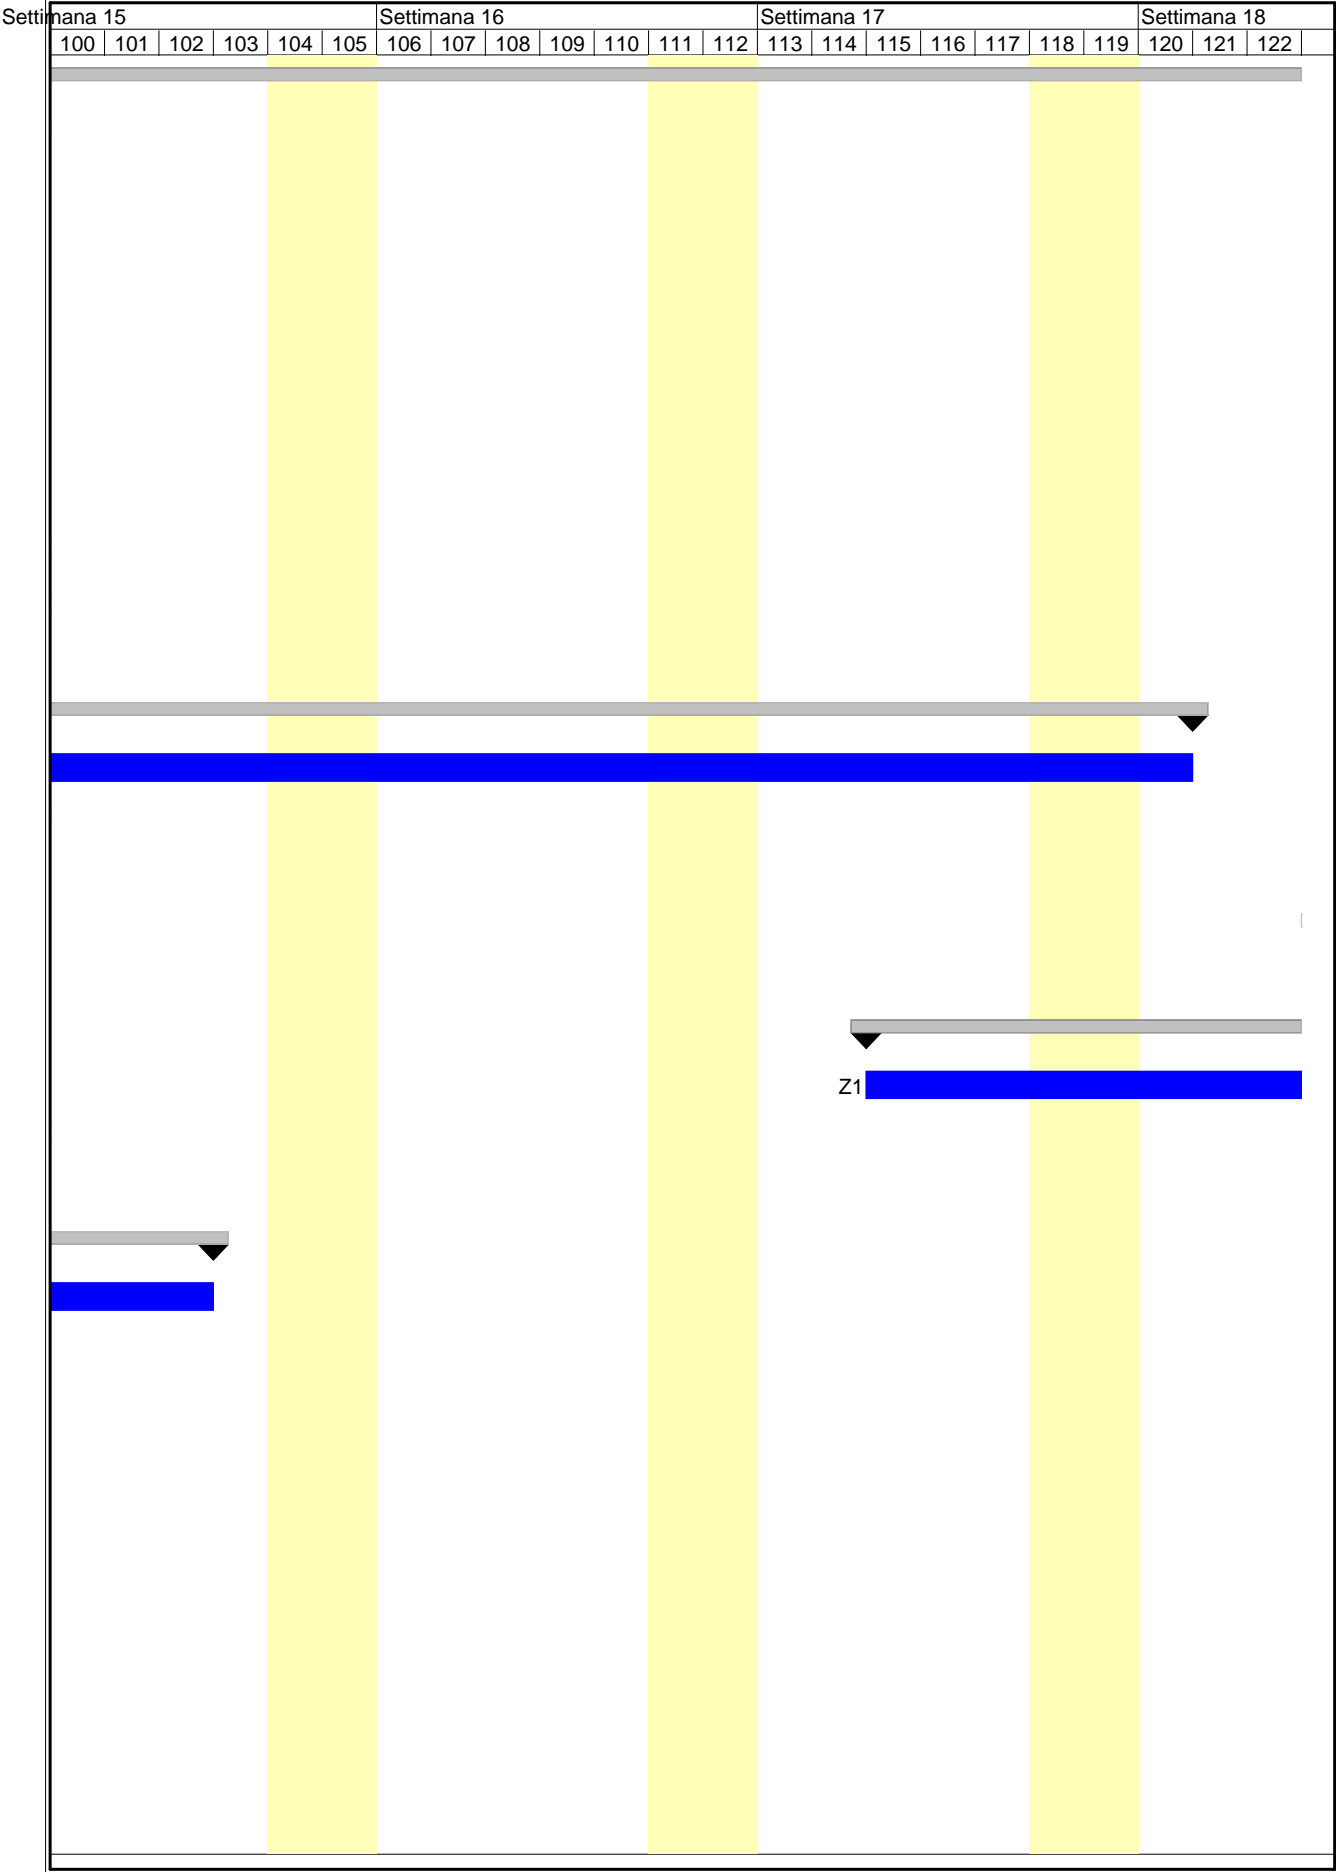

				Settimana 19									Settimana 20					Settimana 21						
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145		

[illegible]
