

Comune di Ariano nel Polesine
Provincia di Rovigo

OGGETTO: Lavori di manutenzione della difesa spondale in erosione in sinistra Po di Goro tra gli st. 42-45 nel Comune di Ariano nel Polesine (RO)

COMMITTENTE: A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo il Dirigente Dott. Ing. Massimo Valente

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Importo soggetto a ribasso	€	136.974,21
Oneri della sicurezza	€	2.695,77
Importo a base di gara	€	139.669,98
Manodopera compresa nei lavori al netto della sicurezza	€	34.101,90
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	40.330,02
Costo complessivo dell'opera	€	180.000,00

Rovigo, lì 25/06/2018

Il Progettista:
F.T. Geom. Angelo Di Ponzio

ID	Nome	Durata 65.00 g - (65.00)	Inizio	Fine	18 mar 19							25 mar 19							01 apr 19							08 apr 19							15 apr 19							22 ap							
					d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g			
1	LM - LAVORI A MISURA	58.00	lun 18/03/19	mer 05/06/19																																											
2	A.108.1.1.2 - FORMAZIONE DI	8.00	mer 03/04/19	ven 12/04/19																																											
3	A.108.1.1.4 - FORMAZIONE DI	8.00	mer 03/04/19	ven 12/04/19																																											
4	A.108.2.1.3 - FORMAZIONE DI BERMA,	15.00	gio 16/05/19	mer 05/06/19																																											
5	A.108.2.1.5 - FORMAZIONE DI BERMA,	16.00	mer 24/04/19	mer 15/05/19																																											
6	A.110.40.5.1 - Fornitura e posa in opera	3.00	lun 15/04/19	mer 17/04/19																																											
7	A.110.40.5.2 - Fornitura e posa in opera	4.00	gio 18/04/19	mar 23/04/19																																											
8	A.108.2.1.13 - SOVRAPPREZZO per la	27.00	mer 24/04/19	gio 30/05/19																																											
9	A.0.0.2 - Sovrapprezzo per	27.00	mer 24/04/19	gio 30/05/19																																											
10	A.105.1.2.1 - SFALCIO DI ERBE	1.00	lun 18/03/19	lun 18/03/19																																											
11	A.105.3.1.1 - DISBOSCAMENTO e	1.00	mar 19/03/19	mar 19/03/19																																											
12	A.105.3.1.2 - DISBOSCAMENTO e	1.00	mer 20/03/19	mer 20/03/19																																											
13	A.105.3.2.1 - TAGLIO ALLA BASE DI	1.00	gio 21/03/19	gio 21/03/19																																											
14	A.10.3.2.2 - TAGLIO ALLA BASE DI	1.00	gio 21/03/19	gio 21/03/19																																											
15	A.106.2.1.2 - SCAVO DI FONDAZIONE	8.00	ven 22/03/19	mar 02/04/19																																											
16	LE - LAVORI IN ECONOMIA	1.00	gio 21/03/19	gio 21/03/19																																											
17	A.2.5.4.1 - PONTONE SEMOVENTE	1.00	gio 21/03/19	gio 21/03/19																																											
18	OS - ONERI PER LA SICUREZZA	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
19	OS.1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
20	S.1.12.1.1 - Cannello carrabile	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
21	S.1.12.1.13 - Fornitura e posa in opera	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
22	S.1.12.2.2/a - Utilizzo di box	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
23	S.1.12.2.2/b - Utilizzo di box	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
24	S.1.12.2.27/a - Fornitura e montaggio di	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
25	S.1.12.2.27/b - b)Bagno chimico	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
26	OS.1.d - MEZZI E SERVIZI DI	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
27	S.4.1.1 - Cassetta di pronto soccorso	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
28	S.4.1.2 - Pacchetto di medicazione con	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
29	S.4.4.2 - Giubbotto di salvataggio	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
30	S.4.7.2 - Nolo di estintore portatile a	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
31	OS.1.e - PROCEDURE PREVISTE PER	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
32	S.5.1.6 - Servizio di segnalazione di	65.00	lun 18/03/19	ven 14/06/19																																											
33	OS.1.g - MISURE DI	2.00	lun 18/03/19	mar 19/03/19																																											
34	S.7.1.1 - Riunione di coordinamento fra	2.00	lun 18/03/19	mar 19/03/19																																											



Agenzia Interregionale per il fiume Po Corso del Popolo, 129 - 45100 ROVIGO - tel. 0425.203111 - fax 0425.422407 - email: ufficio-ro@cert.agenziapo.it

Comune di Ariano nel Polesine
Provincia di Rovigo

OGGETTO: Lavori di manutenzione della difesa spondale in erosione in sinistra Po di Goro tra gli st. 42-45 nel Comune di Ariano nel Polesine (RO)

COMMITTENTE: A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo il Dirigente Dott. Ing. Massimo Valente

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Importo soggetto a ribasso	€	136.974,21
Oneri della sicurezza	€	2.695,77
Importo a base di gara	€	139.669,98
Manodopera compresa nei lavori al netto della sicurezza	€	34.101,90
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	40.330,02
Costo complessivo dell'opera	€	180.000,00

Rovigo, lì 25/06/2018

Il Progettista:
F.T. Geom. Angelo Di Ponzio

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 18/03/2019 a 15/06/2019					
LM - LAVORI A MISURA	€ 133.619,41	€ 133.619,41					
A.108.1.1.2 - FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e...ato sottile). CON TERRENO NON DEMANIALE.	(€ 3.384,28)	(€ 3.384,28)					
A.108.1.1.4 - FORMAZIONE DI RILEVATO per ringrosso e...* (25)2 + 260,07*(25) - 132,14]/1936,27	(€ 523,26)	(€ 523,26)					
A.108.2.1.3 - FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivest...PESO DI 50/100 KG, MISURAZIONE A VOLUME	(€ 30.685,20)	(€ 30.685,20)					
A.108.2.1.5 - FORMAZIONE DI BERMA, scogliera, rivest...ESO DI 100/300 KG, MISURAZIONE A VOLUME	(€ 68.993,97)	(€ 68.993,97)					
A.110.40.5.1 - Fornitura e posa in opera di geotessil...TESO FUORI ACQUA su superfici omogenee.	(€ 2.221,86)	(€ 2.221,86)					
A.110.40.5.2 - Fornitura e posa in opera di geotessil...izioni. STESO SOTTO IL PELO DELL'ACQUA.	(€ 1.688,15)	(€ 1.688,15)					
A.108.2.1.13 - SOVRAPPREZZO per la posa in opera di p...usilio di pontone, MISURAZIONE A VOLUME	(€ 17.227,64)	(€ 17.227,64)					
A.0.0.2 - Sovrapprezzo per movimentazione del pi...me dallo scarico all'imbarco su pontone	(€ 3.987,88)	(€ 3.987,88)					
A.105.1.2.1 - SFALCIO DI ERBE		€ 133.619,41					
A Riportare:							



Agenzia Interregionale per il fiume Po Corso del Popolo, 129 - 45100 ROVIGO - tel. 0425.203111 - fax 0425.422407 - email: ufficio-ro@cert.agenziapo.it

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 18/03/2019 a 15/06/2019					
Riporto:		€ 133.619,41					
INFESTANTI IN GENERE C...RFICI IN GIACITURA PIANA E/O INCLINATA.	(€ 100,04)	(€ 100,04)					
A.105.3.1.1 - DISBOSCAMENTO e DECESPUGLIAMENTO esegu...senze arboree di diametro fino a 20 cm.	(€ 338,40)	(€ 338,40)					
A.105.3.1.2 - DISBOSCAMENTO e DECESPUGLIAMENTO esegu...senze arboree di diametro fino a 20 cm.	(€ 841,80)	(€ 841,80)					
A.105.3.2.1 - TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero...a, di DIAMETRO COMPRESO tra 20 e 40 cm.	(€ 1.416,80)	(€ 1.416,80)					
A.10.3.2.2 - TAGLIO ALLA BASE DI PIANTE (o recupero...altezza, di DIAMETRO SUPERIORE a 40 cm.	(€ 1.669,60)	(€ 1.669,60)					
A.106.2.1.2 - SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGAT...go fino ad una distanza massima di 5 km	(€ 540,53)	(€ 540,53)					
LE - LAVORI IN ECONOMIA	€ 3.354,80	€ 3.354,80					
A.2.5.4.1 - PONTONE SEMOVENTE con due motori da 35...te a lancio, azionati da motore 300 cv.	(€ 3.354,80)	(€ 3.354,80)					
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 2.695,77	€ 2.695,77					
OS.1.a - APPRESTAMENTI PREVISTI	(€ 1.798,40)	(€ 1.798,40)					
S.1.12.1.1 - Cannello carrabile realizzato con tubo...iva di m 2,00, peso indicativo 25 Kg/mq	(€ 230,00)	(€ 230,00)					
S.1.12.1.13 - Fornitura e posa in opera di							
A Riportare:		€ 139.669,98					



Agenzia Interregionale per il fiume Po Corso del Popolo, 129 - 45100 ROVIGO - tel. 0425.203111 - fax 0425.422407 - email: ufficio-ro@cert.agenziapo.it

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 18/03/2019 a 15/06/2019					
Riporto:		€ 139.669,98					
recinzion...successiva rimozione a lavori ultimati.	(€ 968,40)	(€ 968,40)					
S.1.12.2.2/a - Utilizzo di box prefabbricato con stru...8,64 mq) – per il primo mese lavorativo	(€ 190,00)	(€ 190,00)					
S.1.12.2.2/b - Utilizzo di box prefabbricato con stru...) – per ogni mese lavorativo aggiuntivo	(€ 100,00)	(€ 100,00)					
S.1.12.2.27/a - Fornitura e montaggio di bagno chimico...portatile, per il primo mese o frazione	(€ 240,00)	(€ 240,00)					
S.1.12.2.27/b - b)Bagno chimico portatile, per ogni me...razione (Prezzo da indagine di mercato)	(€ 70,00)	(€ 70,00)					
OS.1.d - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	(€ 266,77)	(€ 266,77)					
S.4.1.1 - Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art. 19)	(€ 55,78)	(€ 55,78)					
S.4.1.2 - Pacchetto di medicazione con contenuti... D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28 /07/1958	(€ 15,49)	(€ 15,49)					
S.4.4.2 - Giubbotto di salvataggio galleggiante ...orretta, anche in caso perdita di sensi	(€ 180,00)	(€ 180,00)					
S.4.7.2 - Nolo di estintore portatile a polvere ...per tutta la durata dei lavori. Da Kg 9	(€ 15,50)	(€ 15,50)					
A Riportare:		€ 139.669,98					



Agenzia Interregionale per il fiume Po Corso del Popolo, 129 - 45100 ROVIGO - tel. 0425.203111 - fax 0425.422407 - email: ufficio-ro@cert.agenziapo.it

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 18/03/2019 a 15/06/2019					
Riporto:		€ 139.669,98					
OS.1.e - PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA	(€ 382,72)	(€ 382,72)					
S.5.1.6 - Servizio di segnalazione di lavori / v...mente prestata da operaio specializzato	(€ 382,72)	(€ 382,72)					
OS.1.g - MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva)	(€ 247,88)	(€ 247,88)					
S.7.1.1 - Riunione di coordinamento fra i respon...alizzato, responsabile della sicurezza)	(€ 247,88)	(€ 247,88)					
IMPORTO		€ 139.669,98					
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 139.669,98					
%		100,00%					
% PROGRESSIVA		100,00%					



Agenzia Interregionale per il fiume Po Corso del Popolo, 129 - 45100 ROVIGO - tel. 0425.203111 - fax 0425.422407 - email: ufficio-ro@cert.agenziapo.it

Comune di Ariano nel Polesine
Provincia di Rovigo

OGGETTO: Lavori di manutenzione della difesa spondale in erosione in sinistra Po di Goro tra gli st. 42-45 nel Comune di Ariano nel Polesine (RO)

COMMITTENTE: A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo il Dirigente Dott. Ing. Massimo Valente

PROGRAMMAZIONE S.A.L.

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Importo soggetto a ribasso	€	136.974,21
Oneri della sicurezza	€	2.695,77
Importo a base di gara	€	139.669,98
Manodopera compresa nei lavori al netto della sicurezza	€	34.101,90
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	40.330,02
Costo complessivo dell'opera	€	180.000,00

Rovigo, lì 25/06/2018

Il Progettista:
F.T. Geom. Angelo Di Ponzio

PROGRAMMA S.A.L.						
DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
18/03/2019	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	Inizio lavori
15/06/2019	90	90	€ 139.669,98	€ 139.669,98	100,00%	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 89 (ottantanove) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Comune di Ariano nel Polesine
Provincia di Rovigo

OGGETTO: Lavori di manutenzione della difesa spondale in erosione in sinistra Po di Goro tra gli st. 42-45 nel Comune di Ariano nel Polesine (RO)


COMMITTENTE: A.I.PO Ufficio Periferico di Rovigo il Dirigente Dott. Ing. Massimo Valente

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Importo soggetto a ribasso	€	136.974,21
Oneri della sicurezza	€	2.695,77
Importo a base di gara	€	139.669,98
Manodopera compresa nei lavori al netto della sicurezza	€	34.101,90
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	40.330,02
Costo complessivo dell'opera	€	180.000,00

Rovigo, lì 25/06/2018

Il Progettista:
F.T. Geom. Angelo Di Ponzio

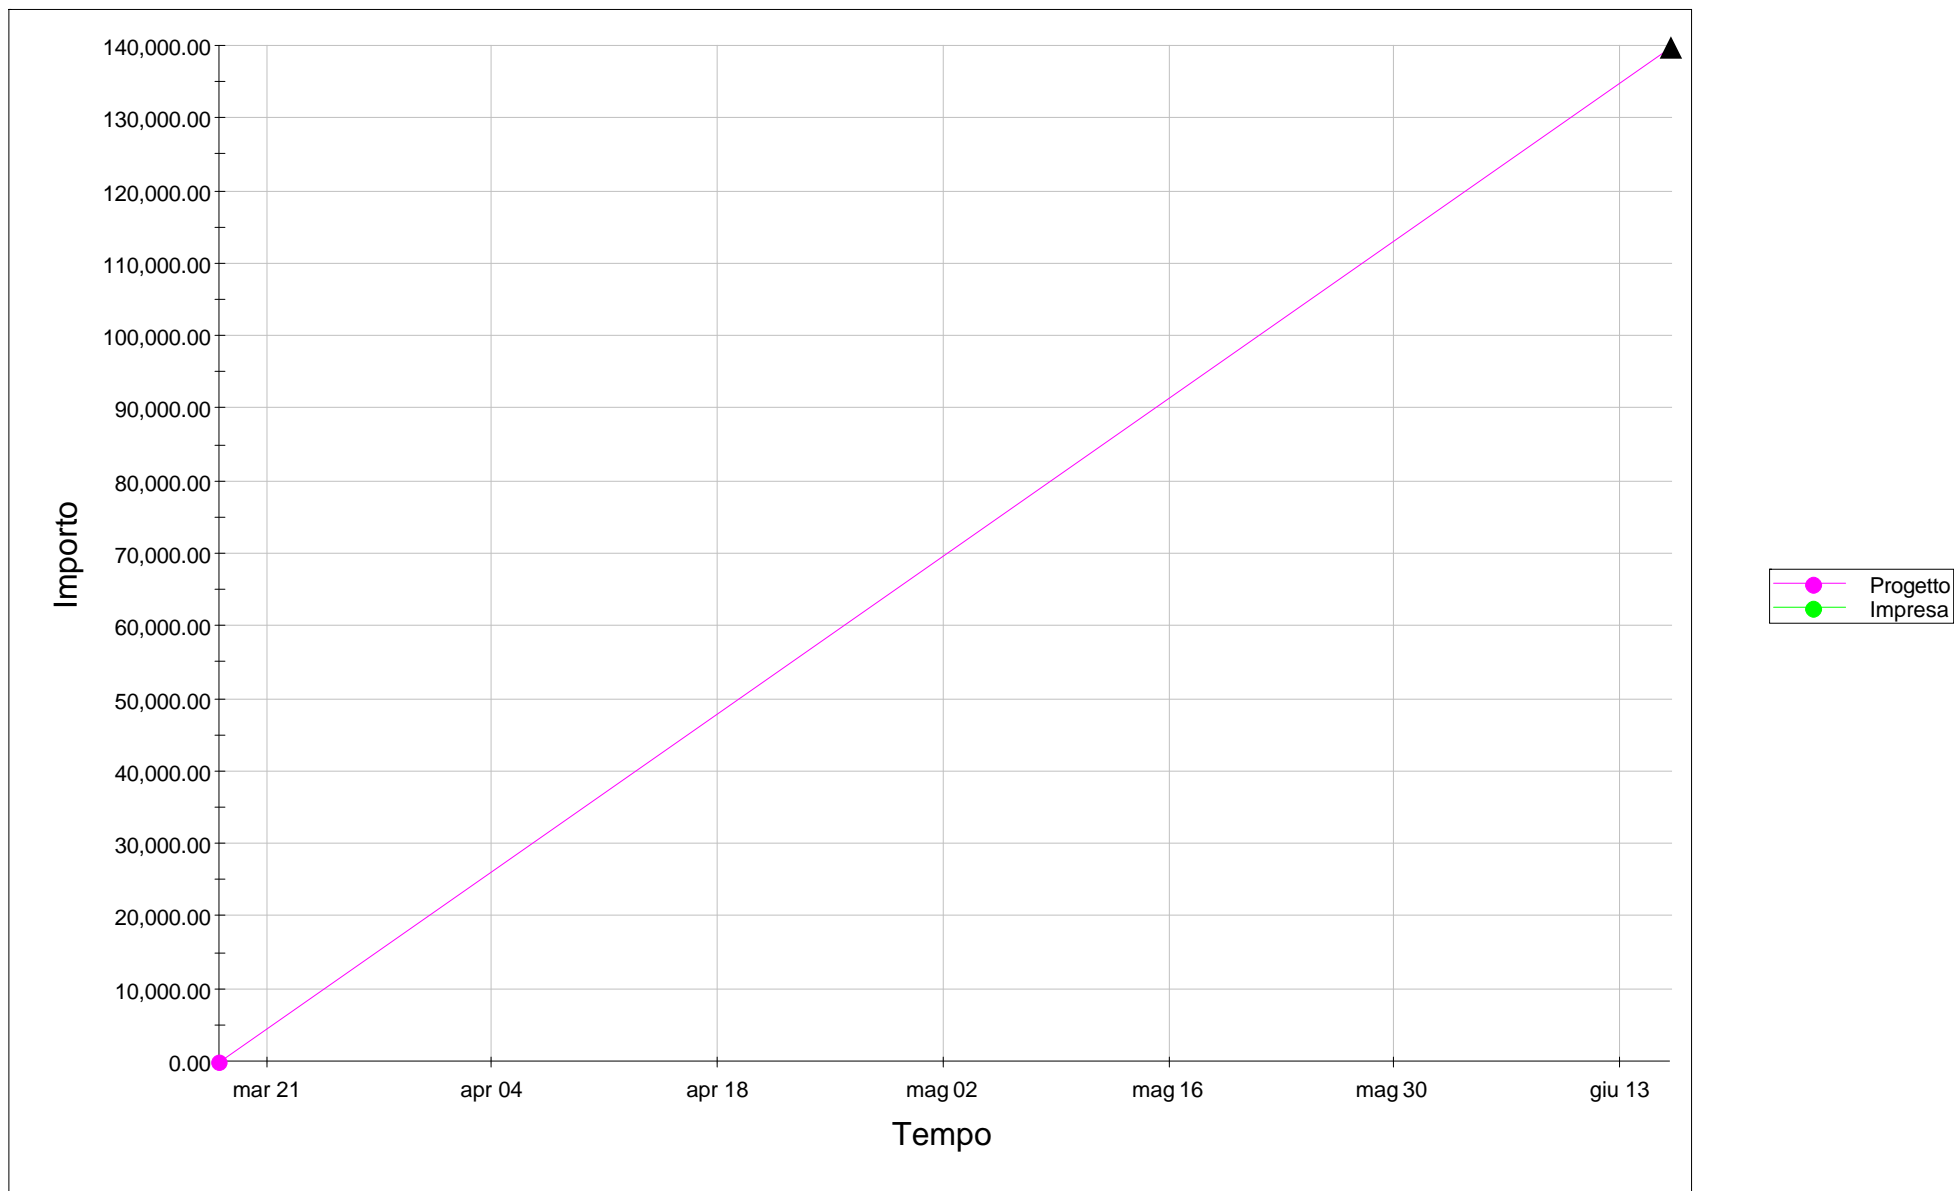

LEGENDA: ● punto che delimita periodi a media di produzione costante
▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
