




FASE 1:
PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE E BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI INESPLOSI (BOB)

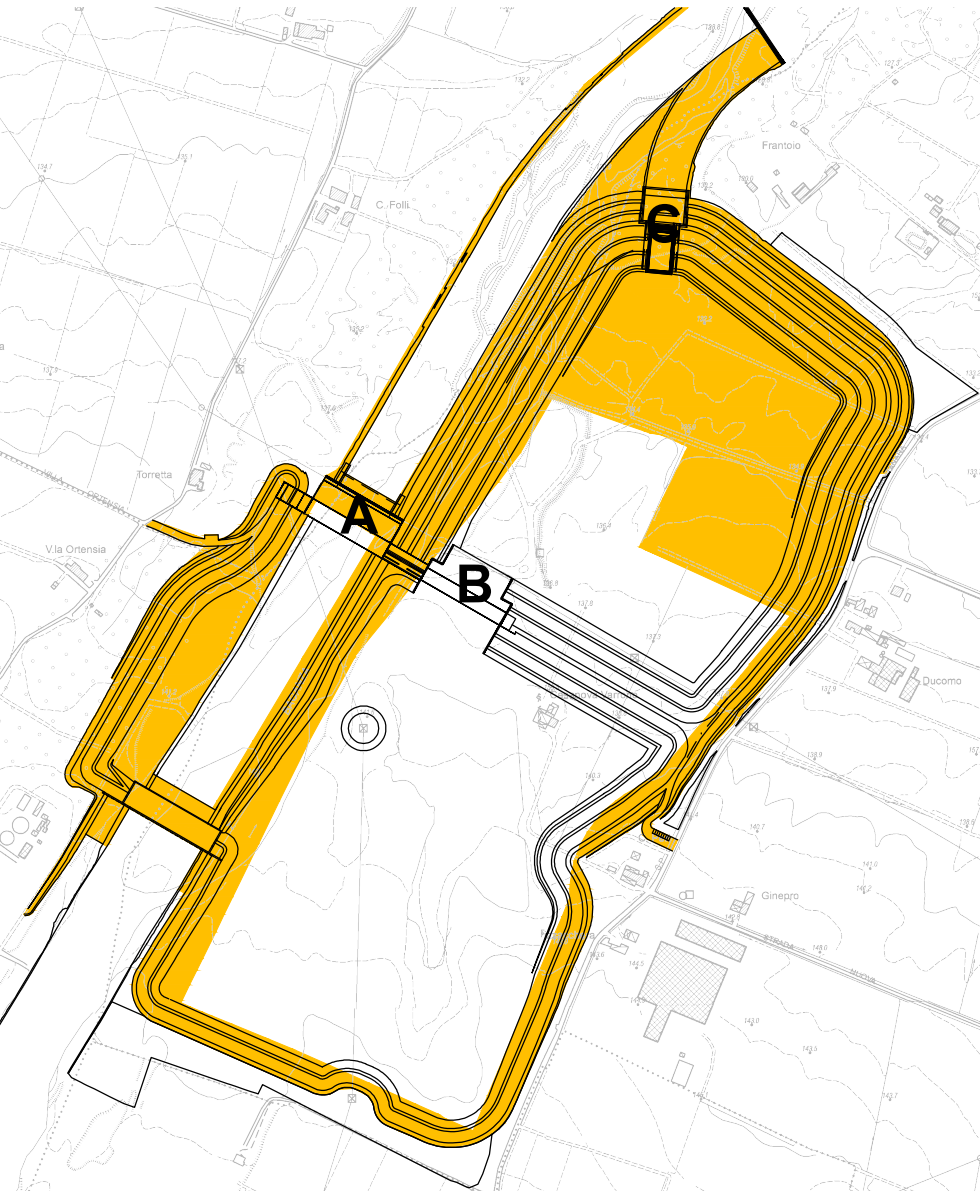


FASE 2:
PRESCAVO DELL'ALVEO (1+3 m) FINALIZZATO AL LIEVE ABBASSAMENTO PIEZOMETRICO NECESSARIO ALLA FASE 3

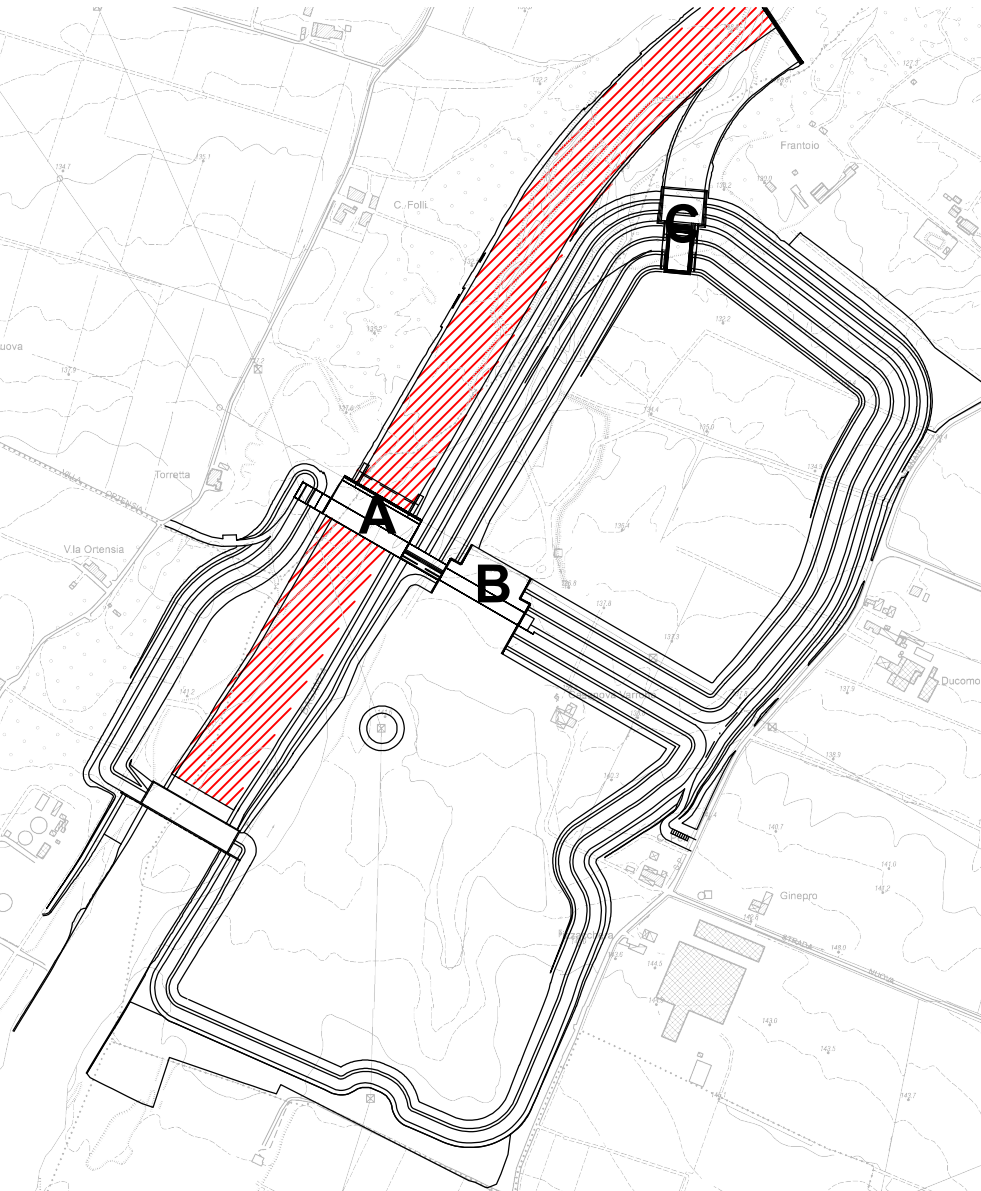


FASE 3:
REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA DELLE GHIAIE DELL'ARGINE OVEST RIEMPIMENTI A SUD E PIANTUMAZIONI

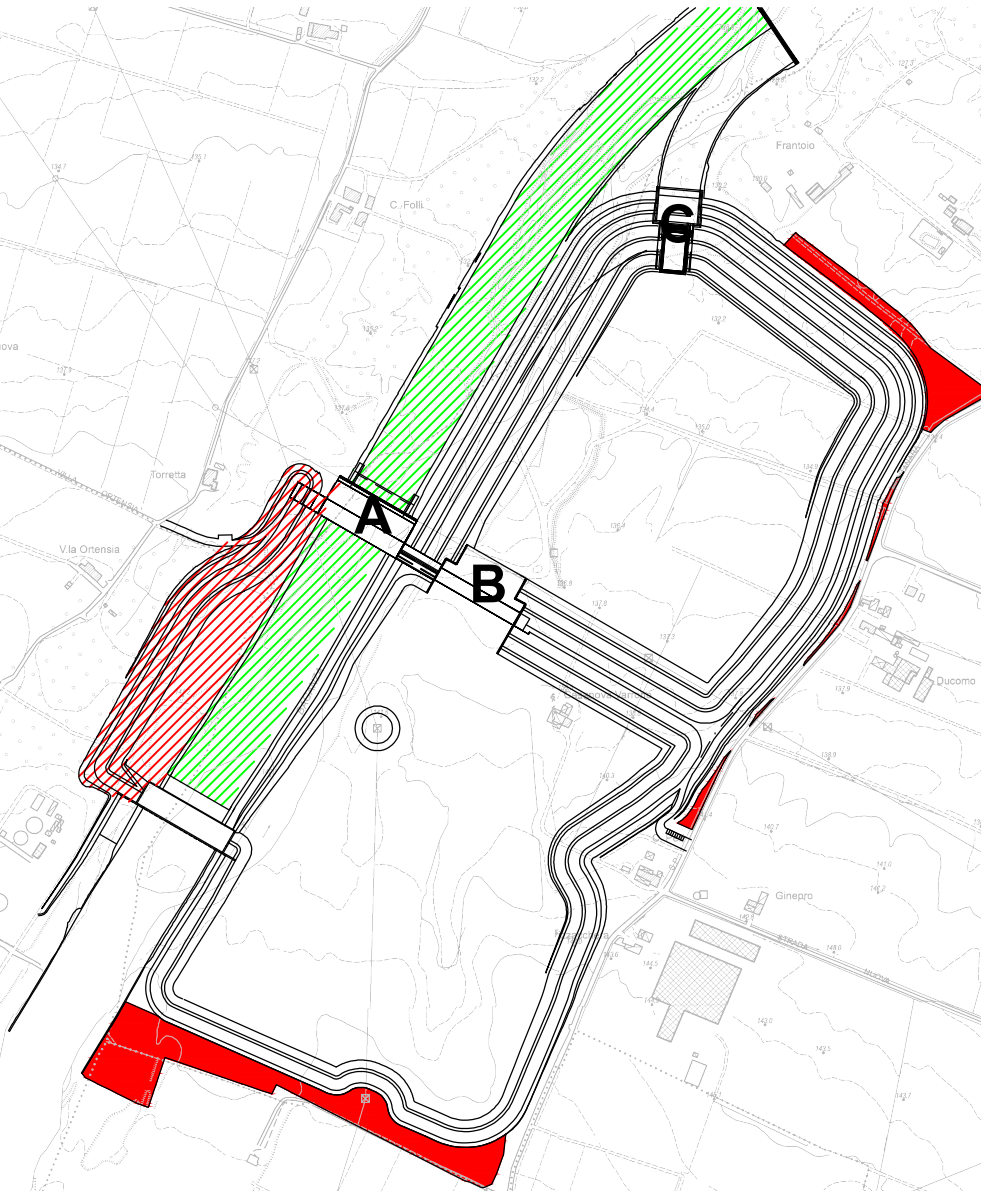


FASE 4:
REALIZZAZIONE DELLA BRIGLIA E DELLE ARGINATURE EST ED OVEST A MONTE DELLA STESSA

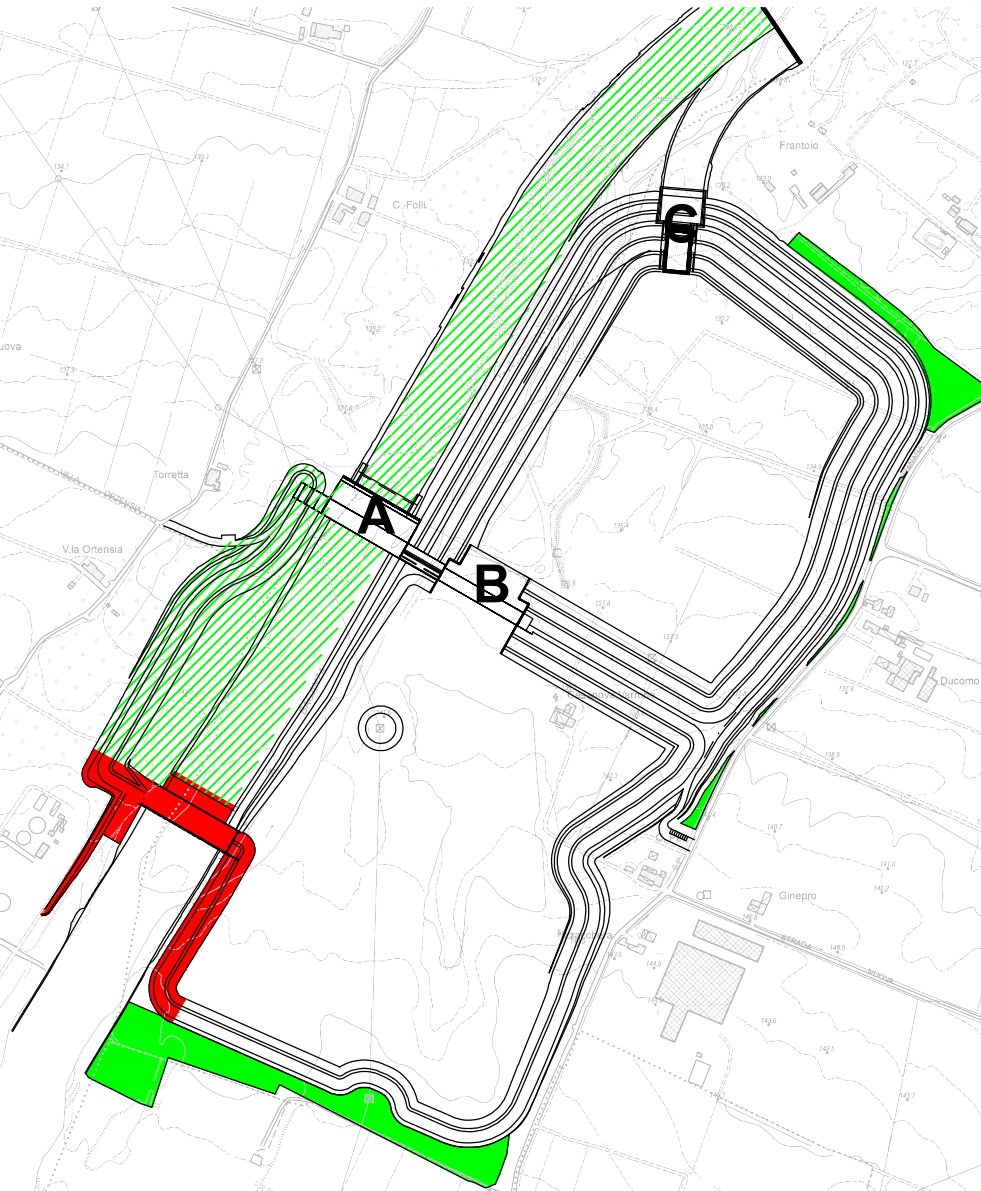


FASE 5:
RISEZIONAMENTO ALVEO DEFINITIVO E REALIZZAZIONE DIFESA SPONDALE ALVEO A MONTE DEL MANUFATTO "A"

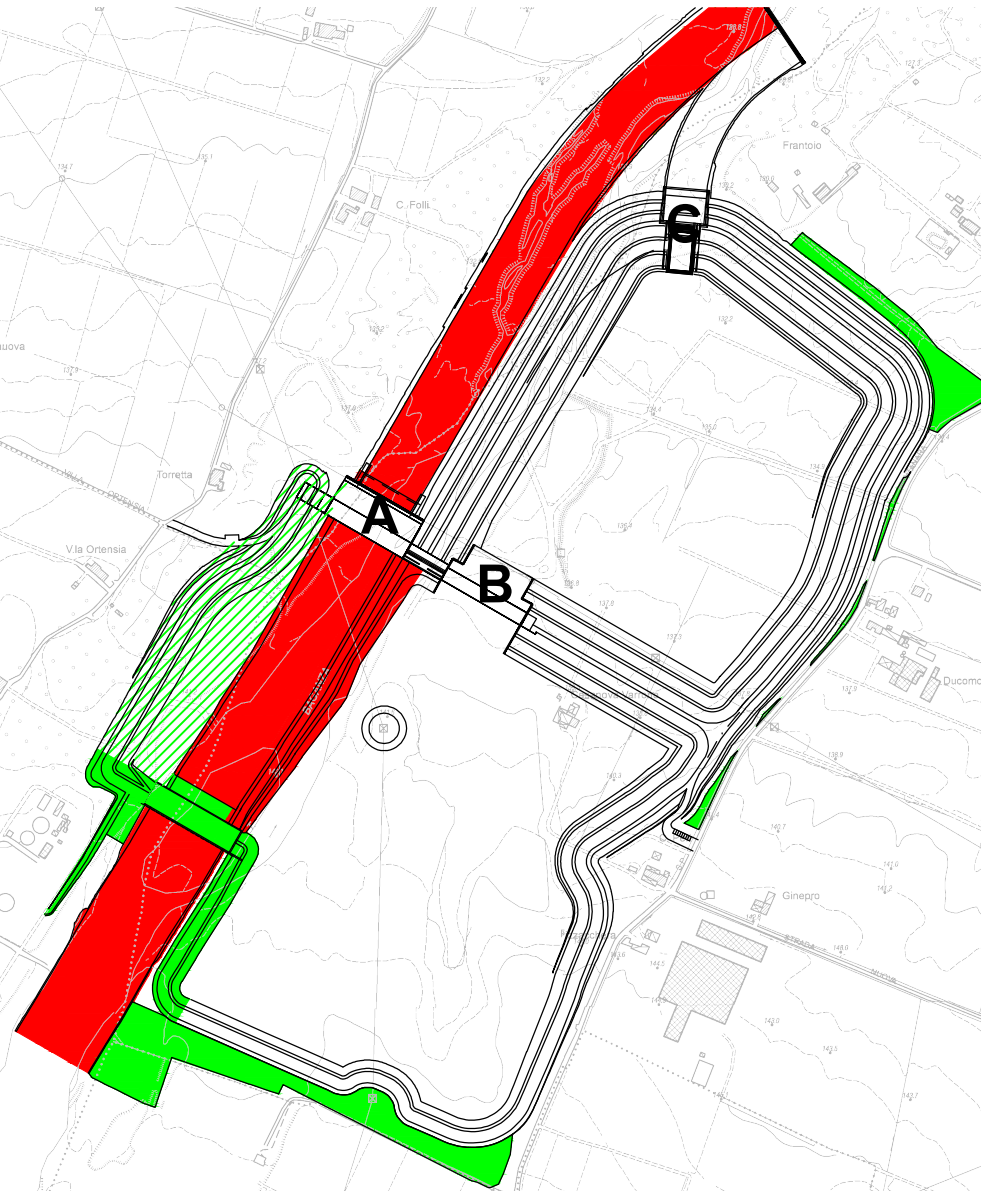


FASE 6:
INIZIO DEGLI SCAVI IN ALVEO A PARTIRE DALLE ZONE NORD E OVEST E REIMPIEGO DEL MATERIALE IDONEO PER LE ARGINATURE EST

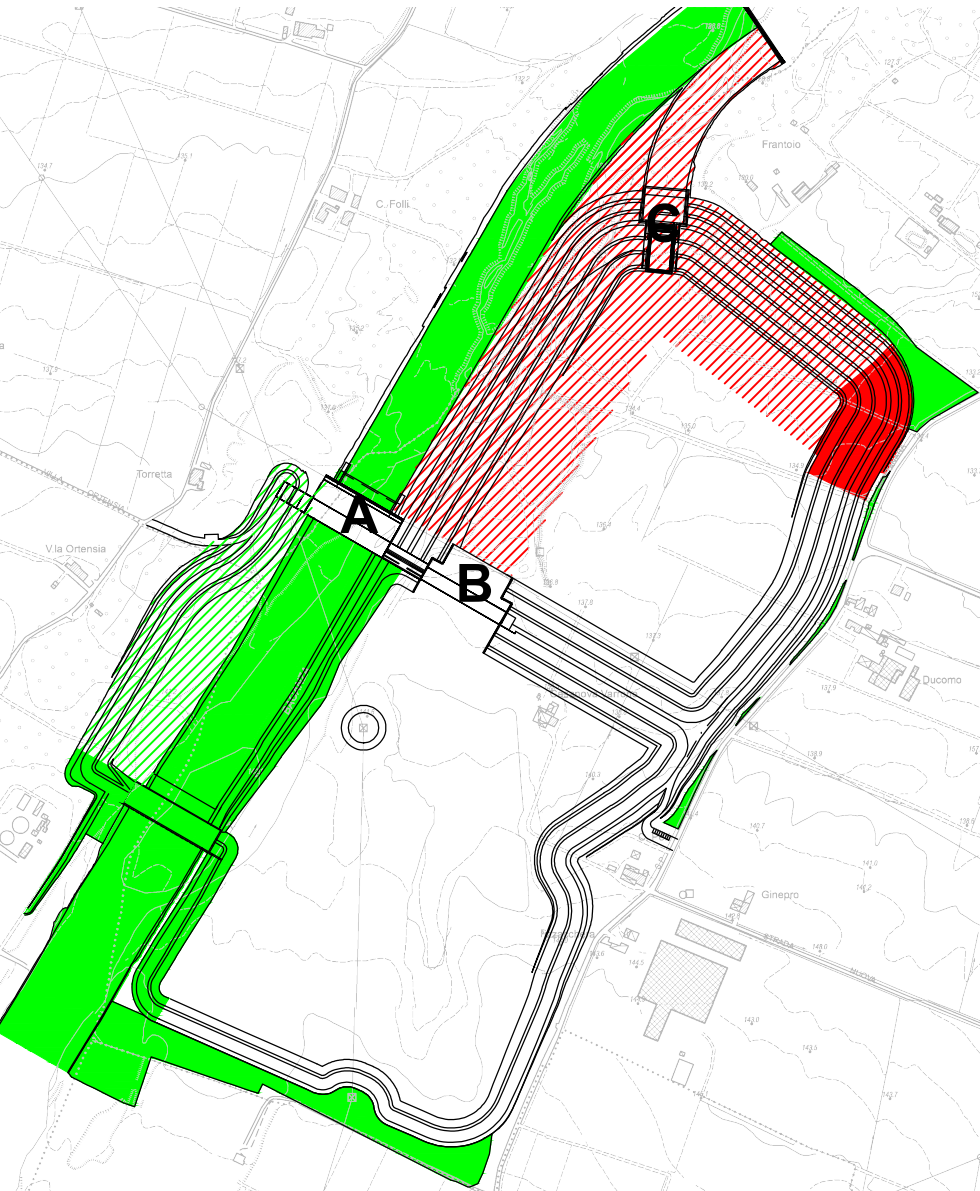


FASE 7:
PROSEGUI DEGLI SCAVI E FORMAZIONE DELLE ARGINATURE LATO EST. REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI "B" E "C"

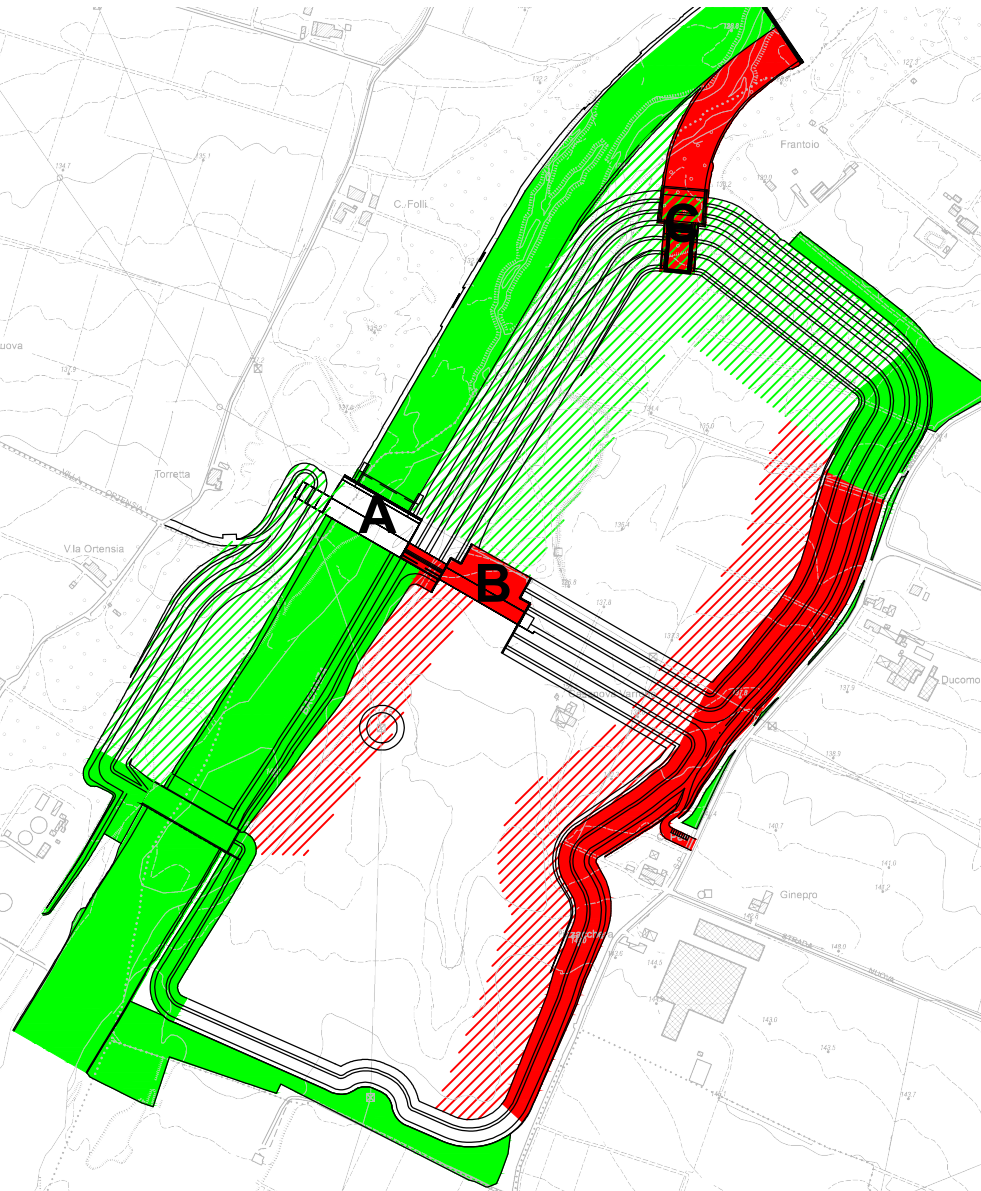


FASE 8:
COMPLETAMENTO SCAVO COMPARTO 1 E INIZIO ARGINATURE TRA 1 E 2

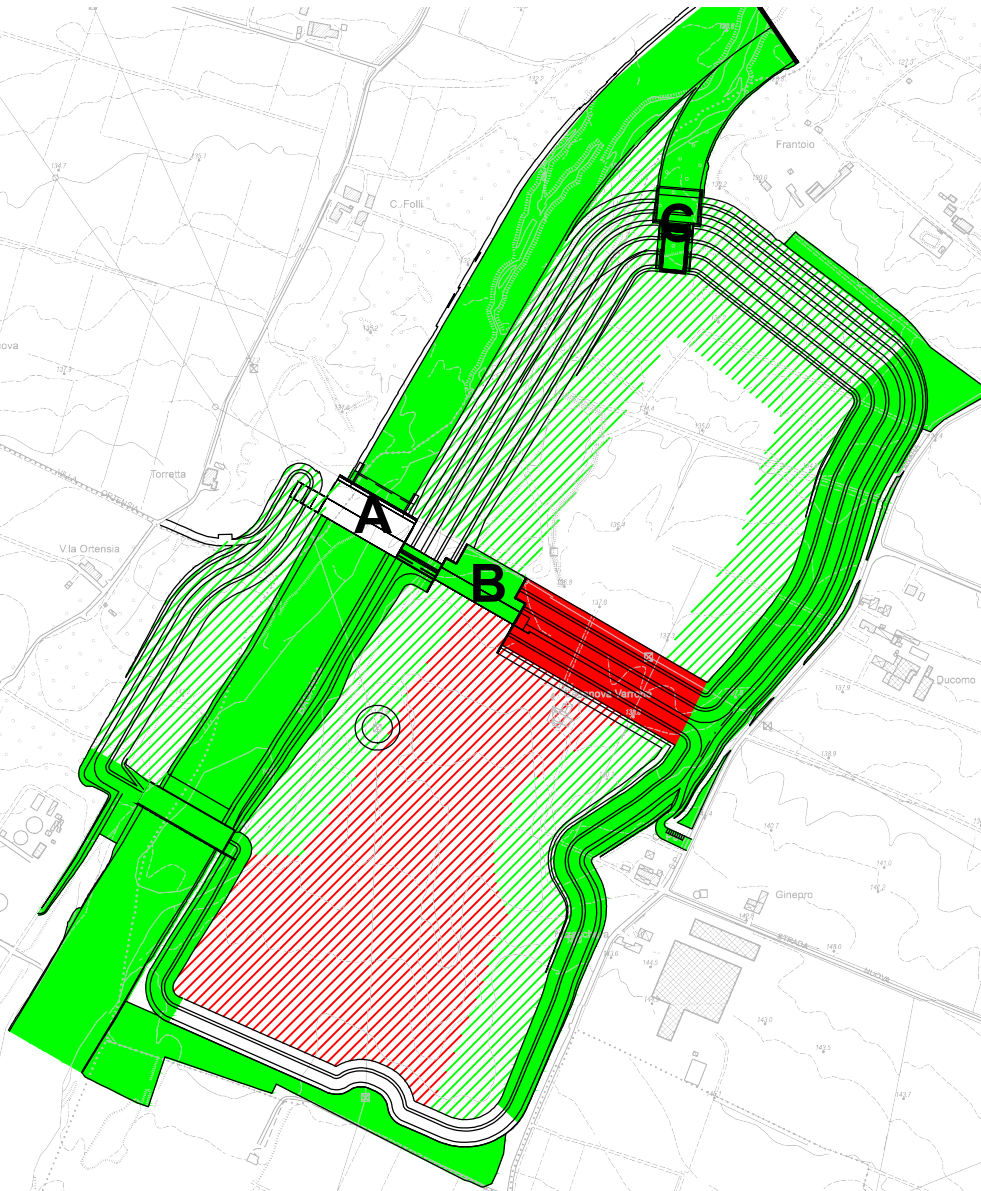


FASE 9:
COMPLETAMENTO ARGINE EST E COMPARTO 1

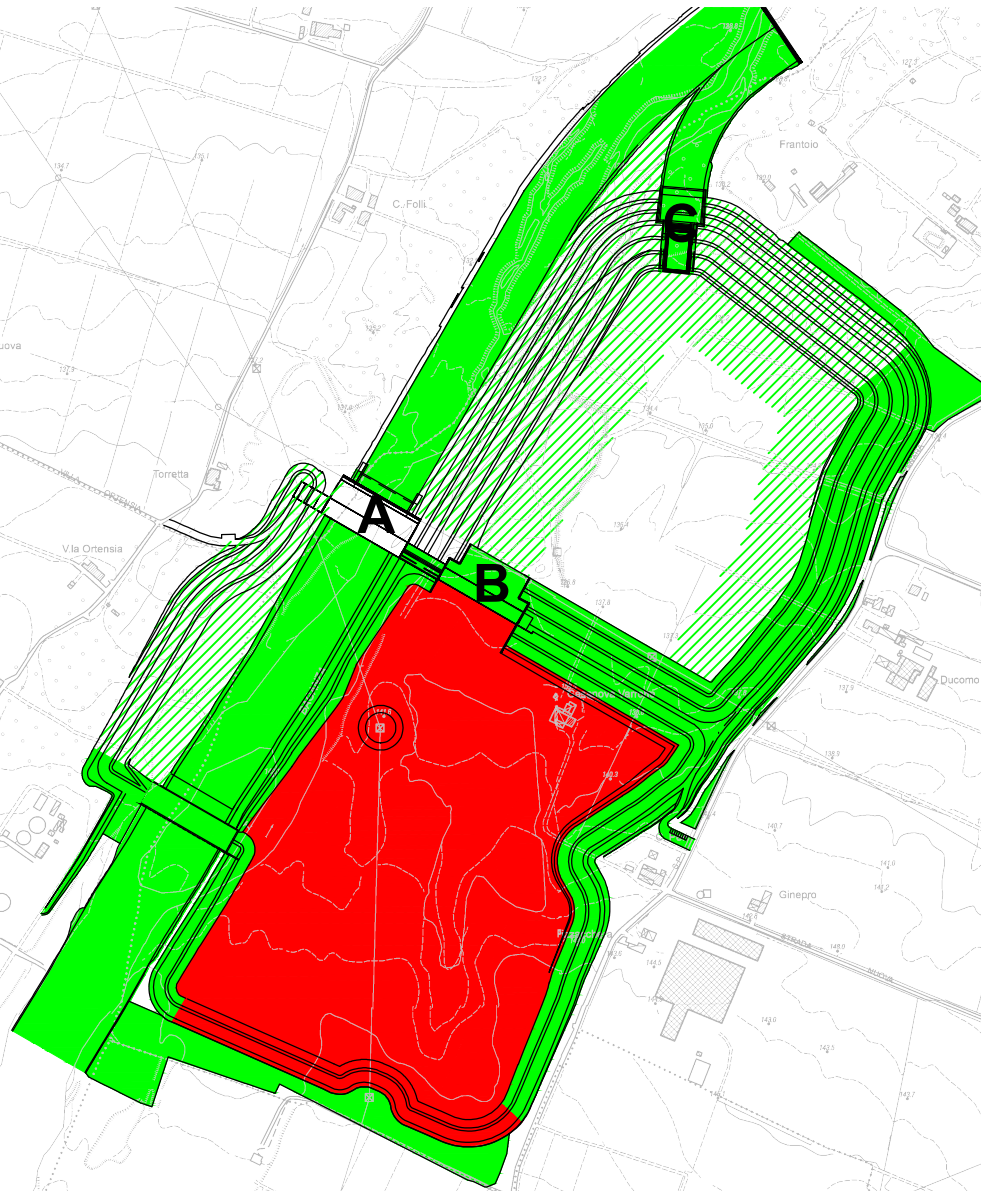


FASE 10:
MANUFATTO "A" IN DUE FASI: PRIMA LA PORZIONE OVEST POI QUELLA EST E COMPLETAMENTO ARGINE OVEST A MONTE DI "A"

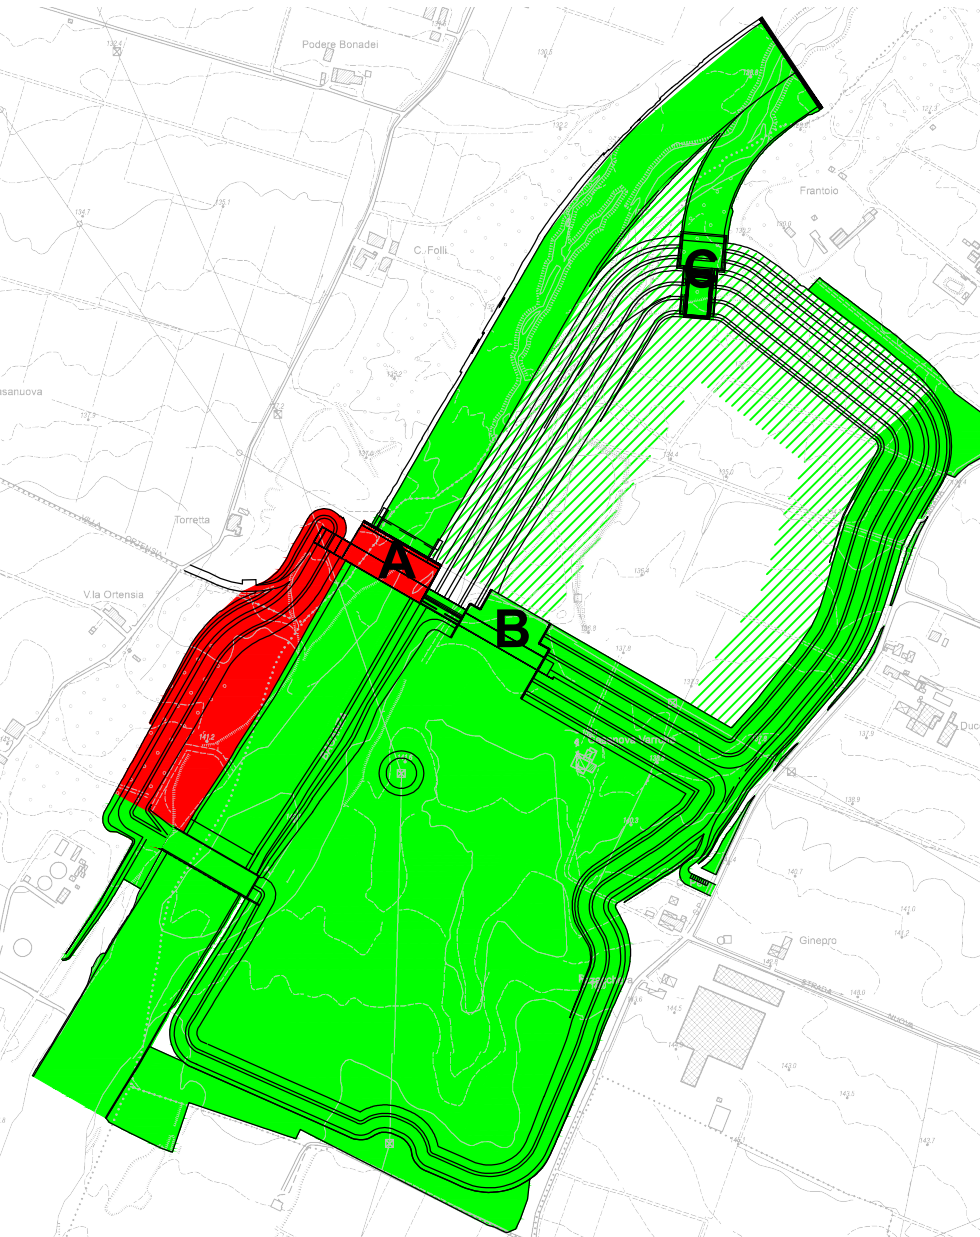


FASE 11:
COMPLETAMENTO SCAVO COMPARTO 2 ED ARGINATURE OVEST E NORD DEL MEDESIMO COMPARTO

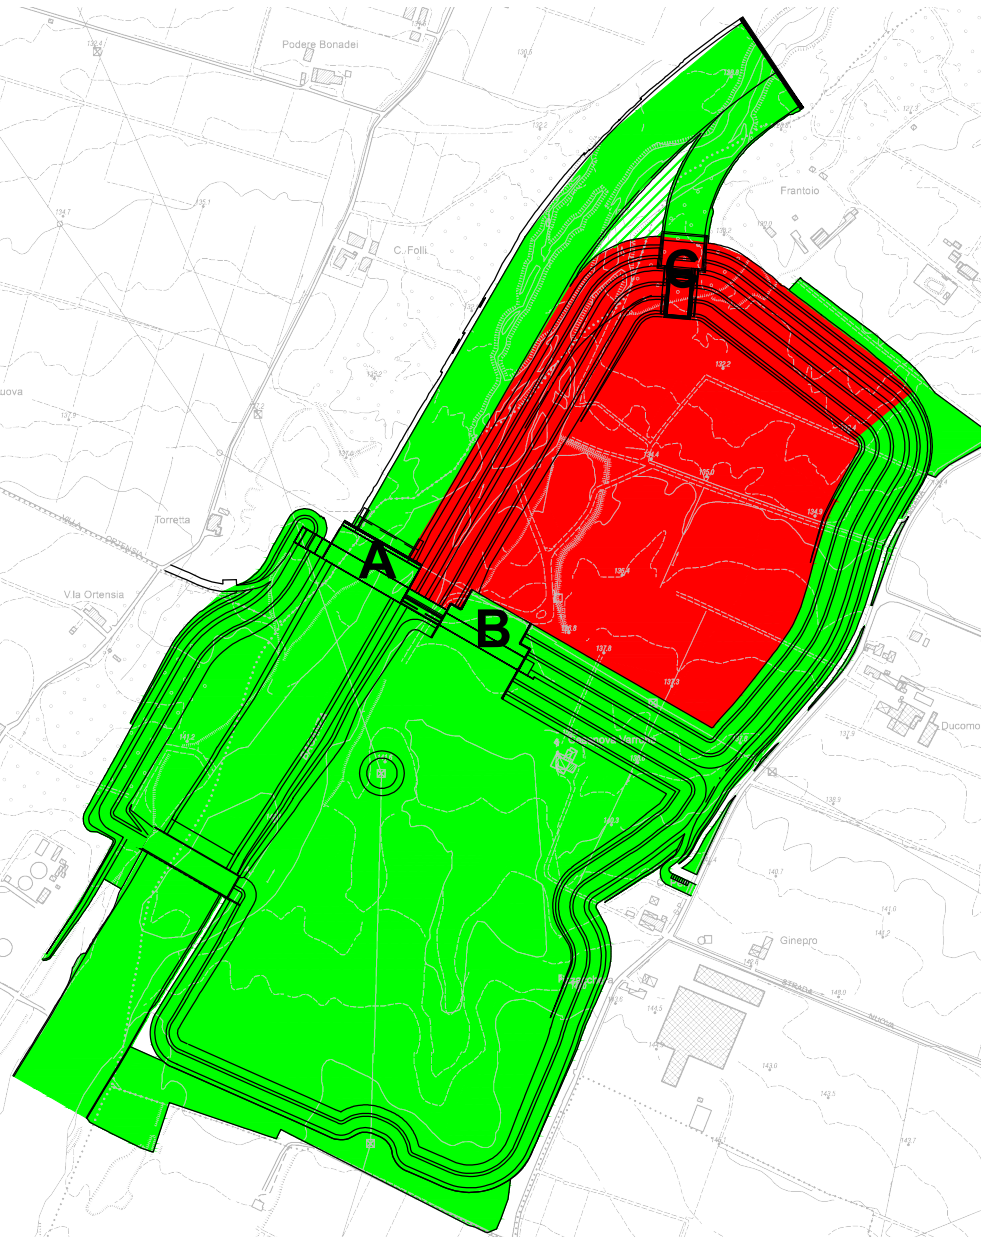

FASE 12:
SMANTELLAMENTO CANTIERE E COMPLETAMENTO/RIPRISTINO PIANTUMAZIONI

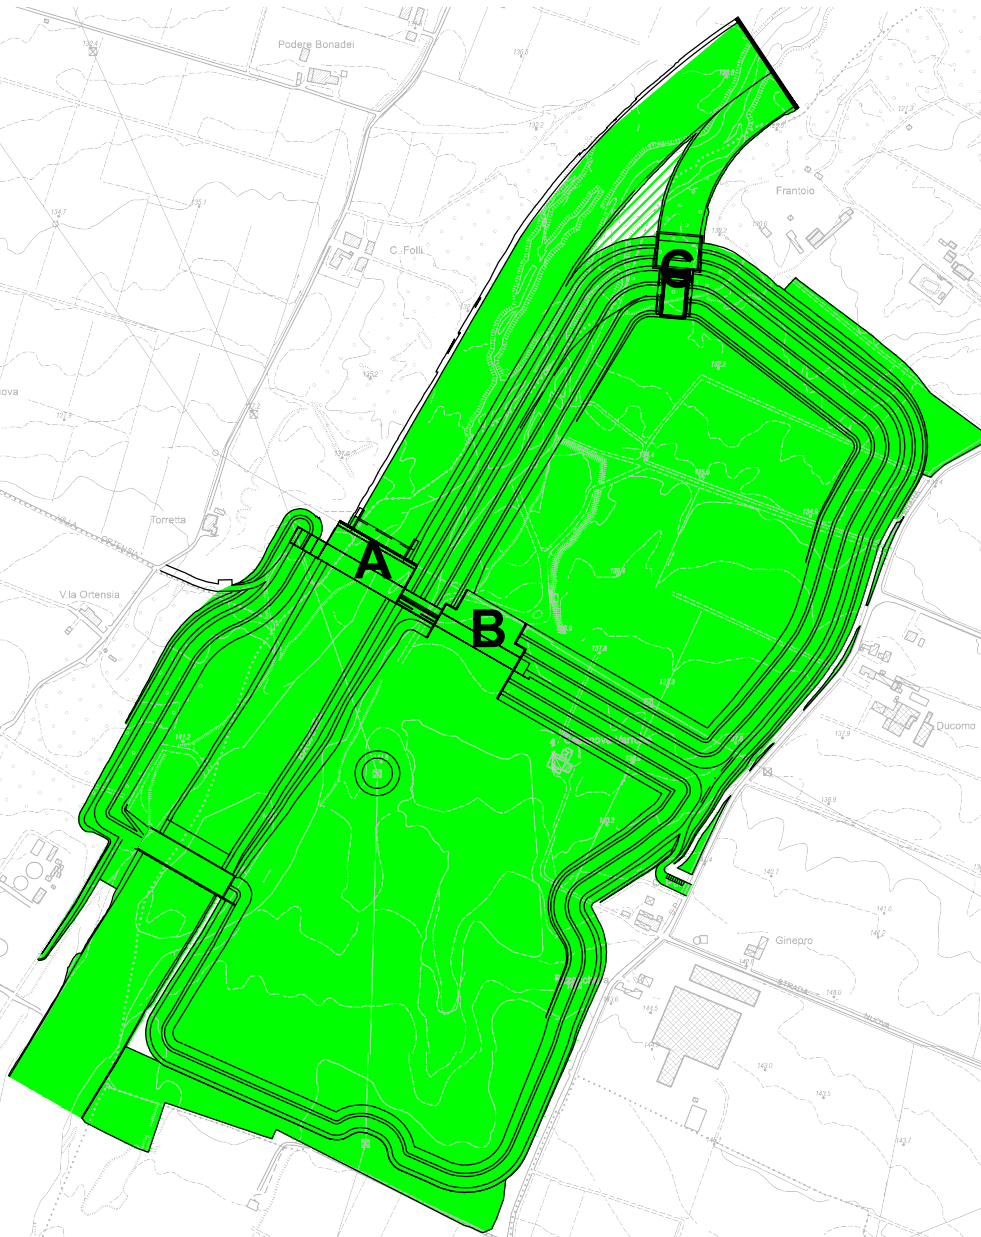


LEGENDA



Lavorazioni in esecuzione nella fase in esame che proseguono successivamente



Lavorazioni in esecuzione e terminata nella fase in esame



Lavorazioni già iniziate che saranno completate nelle fasi successive



Lavorazioni terminate in fasi precedenti

A

Manufatto

IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA
Dott. Ing. Nicola Pissarelli
(documento firmato digitalmente)



CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA NEI COMUNI DI FELINO, SALA BAGANZA, COLLECCHIO E PARMA (PR-E-1047)

PROGETTO DEFINITIVO

A	10/2016	Prima emissione	CE	NP	DC
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE PLANIMETRIA DELLE FASI ESECUTIVE					
IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI: MANDATARIA PROGETTAZIONE GENERALE ED IDROLOGICA MAISONPARTNERS Prof. Ing. Ugo Mayone Dott. Ing. Denis Cerlini Dott. Ing. Marco Salschi Dott. Ing. Nicola Pissarelli Dott. Ing. Michele Ferrari Dott. Ing. Gaetano Di Franco MANDANTE ANALISI DEL RATA FLUVIALE colleselli Prof. Ing. Alberto Bizzani CONSULENTI: MODELLOZIONE FISICA E NUMERICA DICAtea - Università degli studi di Parma (Prof. Ing. Paolo Mignoni) ASPECTI ARCHITETTONICI APUS Archecosystem società Cooperativa (Architettura Lorenza Sironi)			PER IL R.T.P.: Dott. Ing. Denis Cerlini (documento firmato digitalmente) IL R.U.P.: Dott. Ing. Mirella Vergnani (documento firmato digitalmente)		
CODICE ELABORATO: BAG207SICDPL01A ID (1) CAP (2) TIPO (3) DOC (4) PROGR (5-6) REV. (7)			1:10'000 SCALA		
			OTTOBRE 2016		

S.d.r. UTM32N WGS84
