

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO****AREA NAVIGAZIONE IDROVIE E PORTI**

Via Argine Cisa, 11 - Boretto (RE)

opere idrauliche di 2<sup>a</sup> categoria - fiume Po

Legge 18.01.1885 n. 2885

classifica A.I.Po : MN-E-46/NI

Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in Comune di  
Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in Comune di Suzzara (MN) - (Foce  
Oglio) II LOTTO  
(NI-2019-010)

CUP: B92H18000520002

CIG: \_\_\_\_\_

**ANNUALITA' 2021****IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA: Euro 1.000.000,00**

progettazione definitiva ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 50/2016 e s.mm.ii.

n. perizia

prot.n.

elaborato

titolo elaborato

**11****CRONOPROGRAMMA LAVORI**

data

**31.10.2021**

scala elaborato

---

REV.

DATA

DESCRIZIONE REVISIONE

A

B

C

D

**IL PROGETTISTA:**

geom. Fernando ALTOBELLO

**Visto: IL R.U.P.**

Dott. Luca CROSE

**TECNICI COLLABORATORI:**

Ing. Francesco Zerbini - Ing. Giancarlo Focherini

Geom. Geatana Ruggiero - Geom. Alessandro Ferrari

dott. Paolo Piovani - P.I. Stefano Bugnoli

**Verifica per la redazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e succ. mod.**

IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO NETTO	INC. % MANODOPERA	INC. MANODOPERA	SQUADRA TIPO	COSTO GIORN. SQUADRA	GIORNATE LAVORATIVE	UOMINI	UOMINI GIORNO
€ 750 750,00	593 478,26	16,473%	97 763,67		801,44	122	3	366

<b>TOT.</b>	<b>366</b>	<200 UG
-------------	------------	---------


OPERAIO	PAGA ORARIA
operaio specializzato	35,23
operaio qualificato	32,84
operaio comune	29,72

	Op. Specializzato	Op. Qualificato	Op. Comune		
squadra tipo	2		1	3	801,44

nota --> importo netto = importo a b.a. depurato del 26,50 % (spese generali + utile impresa)

DURATA  
(gg)

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	30/05/2022	30/05/2022	0
2	B	Preparazione cantiere	30/05/2022	03/06/2022	4
3	O.007.01.a	RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO	30/05/2022	14/06/2022	15
4	O.010.01.a	FORMAZIONE DI BERMA, SCOGLIERA	04/06/2022	03/08/2022	60
5	O.011.01.a	IMBOTTIMENTO	31/07/2022	22/08/2022	22
6		Oneri sicurezza	30/05/2022	28/08/2022	90
7	C	Fine lavori	25/08/2022	28/08/2022	3

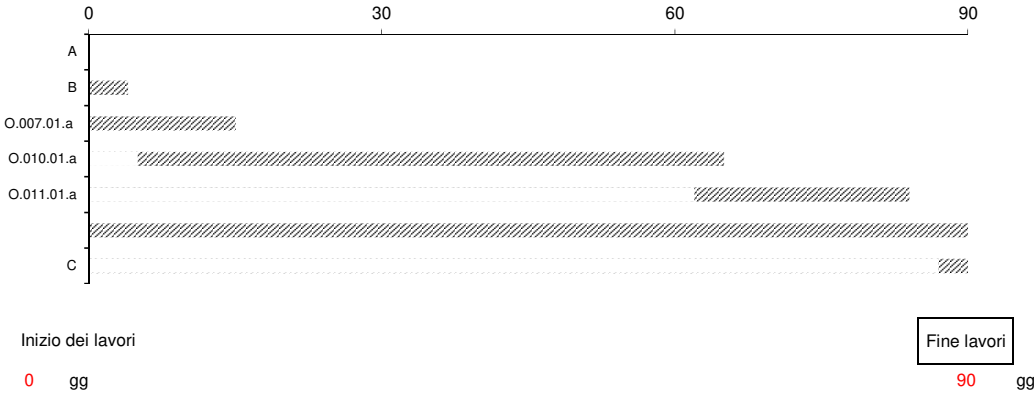

TC

90

gg.

naturali consecutivi
