FASE 1 - PULIZIA DELLA BRIGLIA

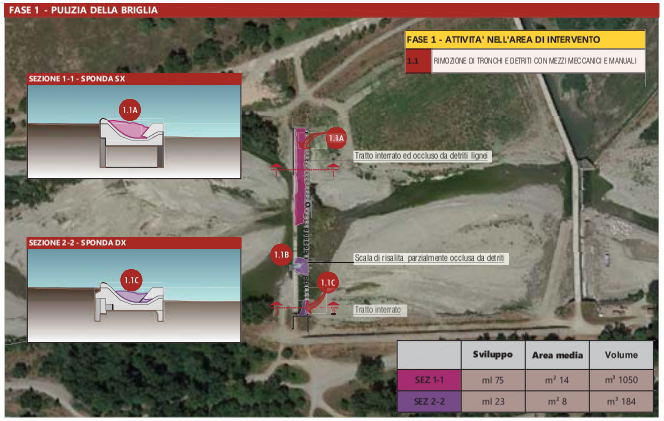

	Sviluppo	Area media	Volume
SEZ 1-1	ml 75	m^2 14	m^3 1050
SEZ 2-2	ml 23	m^2 8	m^3 184

FASE 2 - RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DI SPONDA SX DELLA BRIGLIA

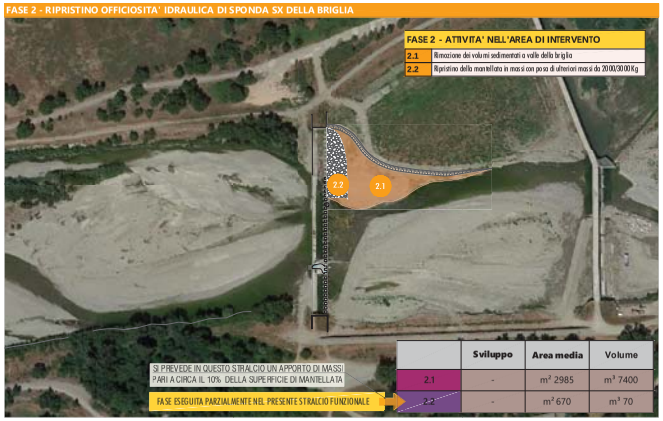

	Sviluppo	Area media	Volume
2.1	-	m^2 2985	m^3 7400
2.2	-	m^2 670	m^3 70

FASE 3 - DEVIAZIONE DELLA SAVENELLA IN SPONDA SX CON REALIZZAZIONE DELLA PRIMA TURA

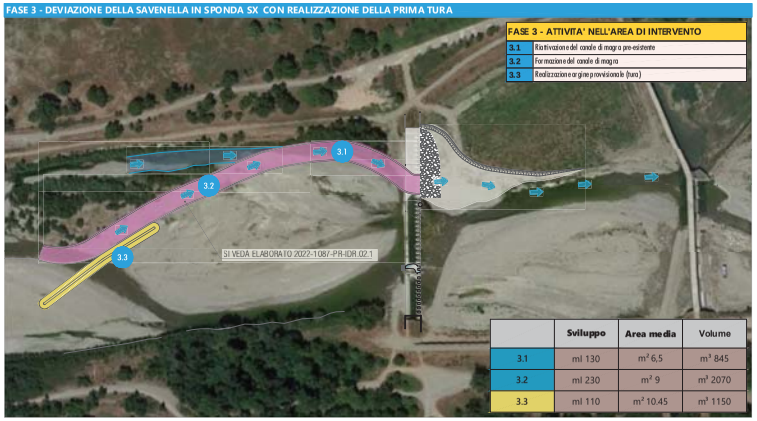

	Sviluppo	Area media	Volume
3.1	ml 130	m^2 6,5	m^3 845
3.2	ml 230	m^2 9	m^3 2070
3.3	ml 110	m^2 10.45	m^3 1150

FASE 4 - FORMAZIONE DELLA TURA DI DELIMITAZIONE AREA CANTIERE IN DX - REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO

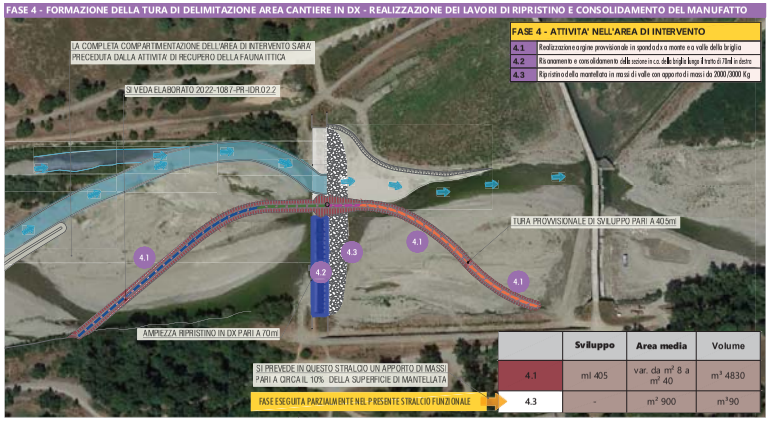

	Sviluppo	Area media	Volume
4.1	ml 405	var. da m^2 8 a m^2 40	m^3 4830
4.3	-	m^2 900	m^3 90

FASE 5 - RIMOZIONE DEL RILEVATO PROVVISIONALE E SISTEMAZIONE D'ALVEO CON COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELLA DIFESA DI VALLE

	Sviluppo	Area media	Volume
5.2	-	m^2 140	m^3 15

FASE 6 - REALIZZAZIONE DI SAVENELLA CENTRALE ED ELIMINAZIONE DELLA TURA DI MONTE

	Sviluppo	Area media	Volume
6A.1	ml 235	var. da m^2 16 a m^2 32	m^3 5785

SITUAZIONE FINALE AL TERMINE DELL'INTERVENTO

Committente: Agenzia Interregionale per il fiume Po Strada Giuseppe Garibaldi 75 43121 Parma

AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po

Commessa:

PR-E-1087 Lavori urgenti di messa in sicurezza della briglia selettiva a funzione del manufatto limitatore della cassa di espansione di monte del torrente Enza
CUP B77H22000180001

PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO
SISTEMAZIONE D'ALVEO

Sequenza esecutiva dei lavori di Primo Stralcio

Scala: VAR.

2022-1087-PR-IDR.1.1

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	14.11.2022	Emissione	MCA	RR	RR

I PROGETTISTI: ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI PARMA Dott. Ing. ROSARIA RAGAZZINI

IL RUP Dott. Ing. Monica Larocca

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge.
Di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione
