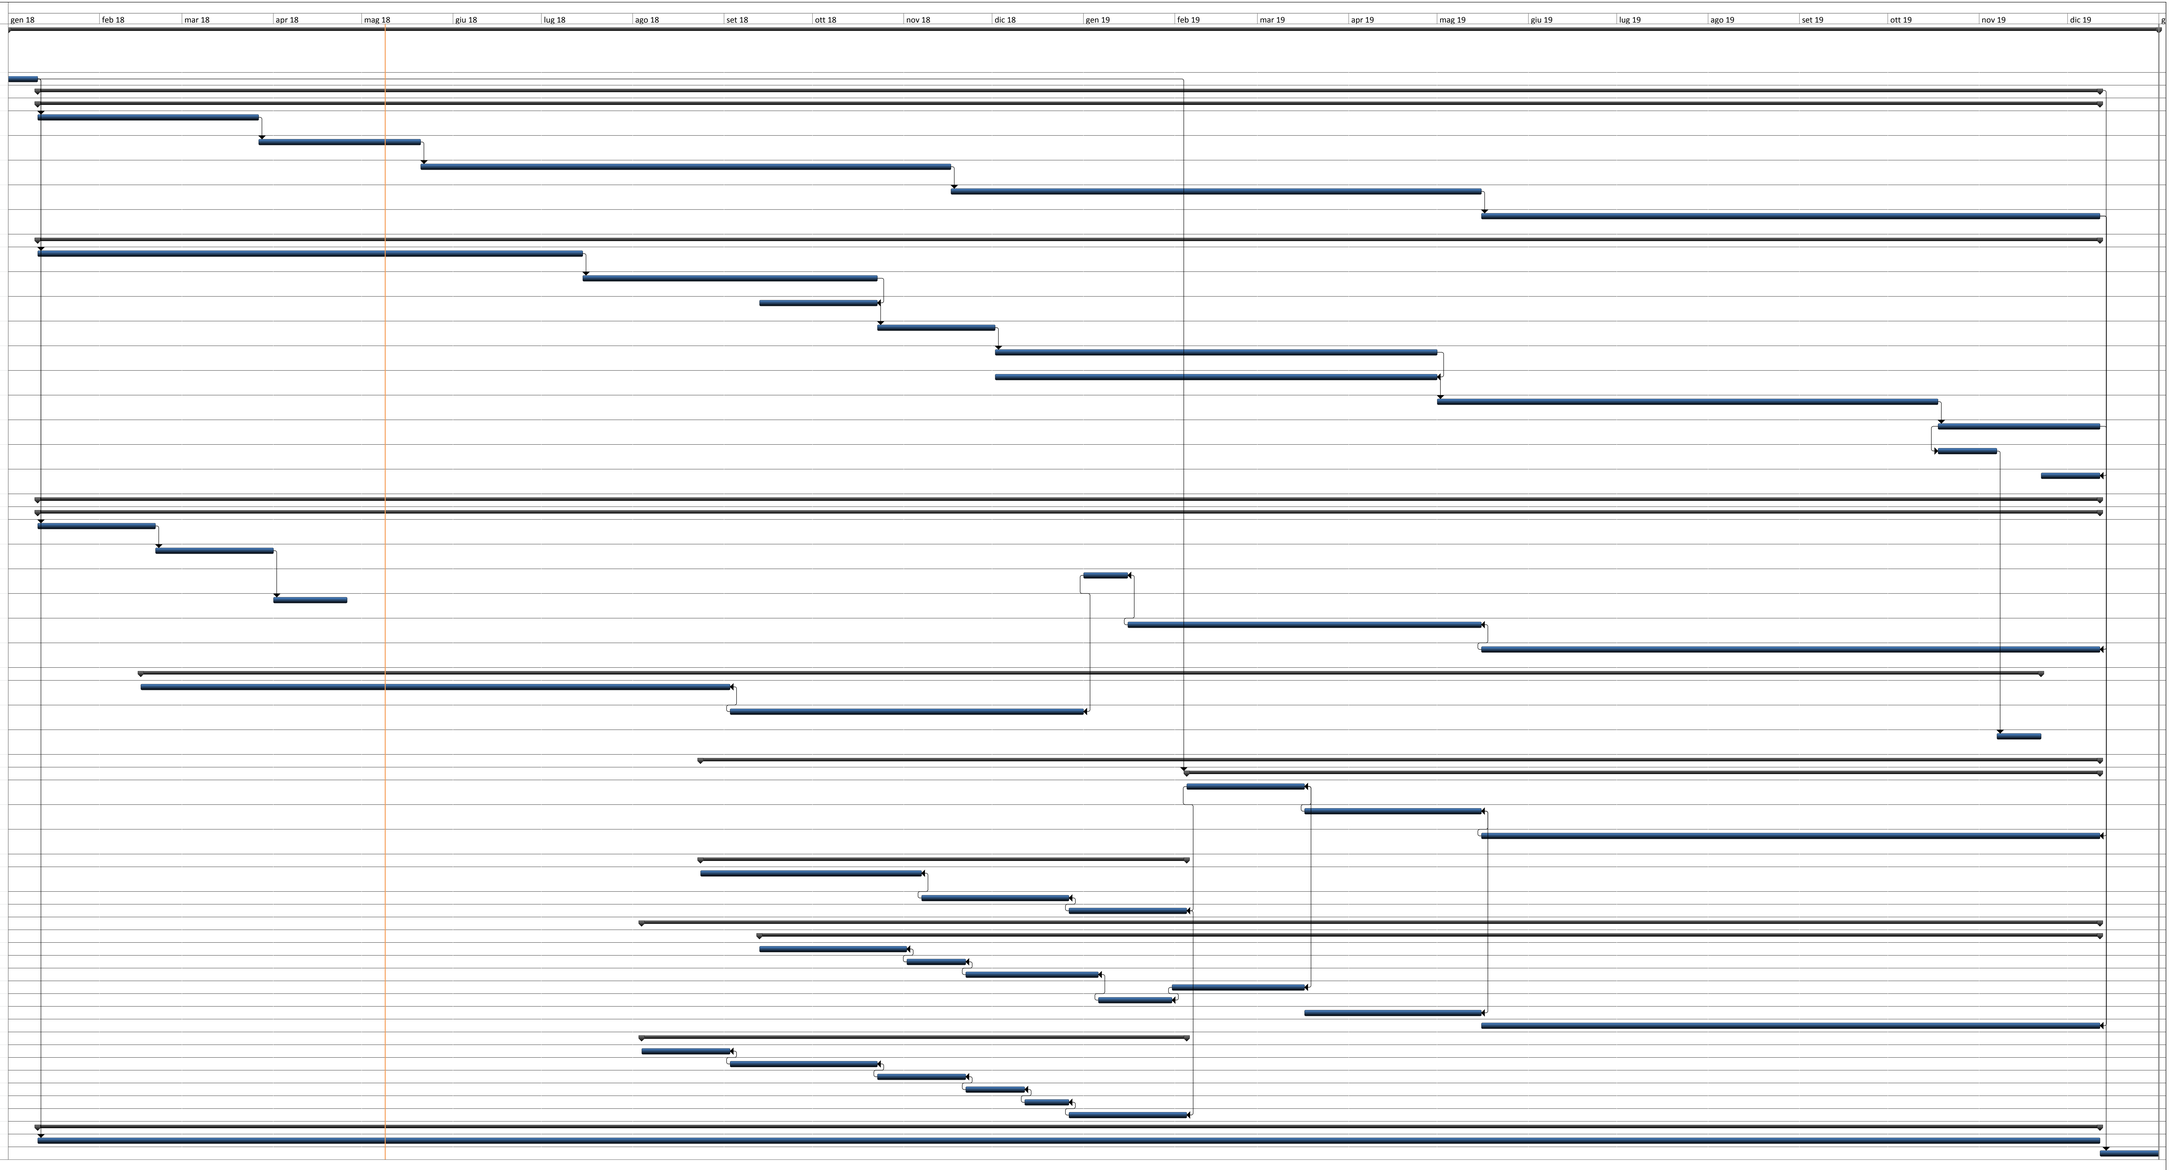ID	Nome attività	Durata
1	**F. SECCHIA - (MO-E-1323)-Adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale difensivo tramite interventi di adeguamento in quota ed in sagoma ... per garantire franco 1 metro, rispetto piena TR 20 anni - II Stralcio - I Lotto**	**730 g**
2	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE	10 g
3	**INTERVENTI DI RINGROSSO E DI RIALZO ARGINALE**	**700 g**
4	**SPONDA DESTRA**	**700 g**
5	Sezione tipo A.2a III - Da progr. 14+955 a progr. 15+755 - Lunghezza pari a circa 800 m	75 g
6	Sezione tipo B.2b III - Da progr. 15+755 a progr. 16+330 - Lunghezza pari a circa 575 m	55 g
7	Sezione tipo A.2b III - da progr. 16+330 a progr. 18+735,90 - Lunghezza pari a circa 2.405,90 m	180 g
8	Sezione tipo A.3b III - da progr. 44+280 a progr. 46+450 - Lunghezza pari a circa 2.170 m	180 g
9	Sezione tipo B.3b III - da progr. 46+450 a progr. 46+839,9 - Lunghezza pari a circa 389,90 m	210 g
10	**SPONDA SINISTRA**	**700 g**
11	Sezione tipo A.2a IV da progr. 10+585 a progr. 12+795, per una lunghezza pari a circa 2.210 m;	185 g
12	Sezione tipo A.2b IV da progr. 12+795 a progr. 13+983,15, per una lunghezza pari a circa 1.188,15 m;	100 g
13	Sezione tipo L da progr. 13+499,15 a progr. 13+983,15, per una lunghezza pari a circa 484 m;	40 g
14	Sezione tipo A.4b IV da progr. 13+983,15 a progr. 14+429,45, per una lunghezza pari a circa 446,3 m;	40 g
15	Sezione tipo A.2b IV da progr. 14+429,45 a progr. 16+198,60, per una lunghezza pari a circa 1.769,15 m;	150 g
16	Sezione tipo L da progr. 14+429,45 a progr. 16+198,60, per una lunghezza pari a circa 1.769,15 m;	150 g
17	Sezione tipo A.3b IV da progr. 42+112 a progr. 44+115, per una lunghezza pari a circa 2.003 m;	170 g
18	Sezione tipo B.3b IV da progr. 44+115 a progr. 44+759,60, per una lunghezza pari a circa 644,6 m;	55 g
19	Sezione tipo L da progr. 44+115 a progr. 44+383,90, per una lunghezza pari a circa 268,9 m;	20 g
20	Sezione tipo L da progr. 44+490,80 a progr. 44+759,60, per una lunghezza pari a circa 268,8 m.	20 g
21	**INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA FILTRAZIONE**	**700 g**
22	**SPONDA DESTRA**	**700 g**
23	Sezione tipo C.1 -Da progr. 22+690 a progr. 22+880, per una lunghezza pari a 190 m	40 g
24	Sezione tipo C.1 - Da progr. 25+934 a progr. 26+134, per una lunghezza pari a 200 m	40 g
25	Sezione tipo C.2 - Da progr. 33+930 a progr. 33+960, per un lunghezza pari a circa 30 m	15 g
26	Sezione tipo C.1 - Da progr. 41+525 a progr. 41+643, per una lunghezza pari a 118 m	25 g
27	Sezione tipo C.2 -Da progr. 42+320 a progr. 42+555, per una lunghezza pari a circa 235 m	120 g
28	Sezione tipo C.2 -Da progr. 46+420 a progr. 46+838, per una lunghezza pari a circa 418 m	210 g
29	**SPONDA SINISTRA**	**645 g**
30	Sezione tipo C.2 - Da progr. 34+660 a progr. 35+155, per una lunghezza pari a circa 495 m;	200 g
31	Sezione tipo C.2 - Da progr. 37+875 a progr. 38+170, per una lunghezza pari a 295 m.	120 g
32	Sezione tipo C.1 - Da progr. 44+375 a progr. 44+495, per una lunghezza pari a 120 m	15 g
33	**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ARGINALE**	**475 g**
34	**SPONDA DESTRA**	**310 g**
35	Da progr. 42+320 a progr. 42+555, per una lunghezza pari a circa 235 m	40 g
36	Da progr. 45+500 a progr. 45+838, per una lunghezza pari a circa 338 m	60 g
37	Da progr. 46+420 a progr. 46+840, per una lunghezza pari a circa 420 m	210 g
38	**SPONDA SINISTRA**	**165 g**
39	Da progr. 34+660 a progr. 35+155, per una lunghezza pari a circa 495 m.	75 g
40	Da progr. 37+875 a progr. 38+170, per una lunghezza pari a 295 m	50 g
41	Da progr. 45+325 a progr. 45+575, per una lunghezza pari a 250 m	40 g
42	**INTERVENTI DI PROTEZIONE SPONDALE**	**495 g**
43	**SPONDA DESTRA**	**455 g**
44	Da Progr. 25+730 a Progr. 25+980 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2	50 g
45	Da Progr. 33+930 a Progr. 34+020 - L = 97 - SEZIONE TIPO D.2	20 g
46	Da Progr. 39+005 a Progr. 39+236 - L = 231 - SEZIONE TIPO D.2	45 g
47	Da Progr. 42+320 a Progr. 42+555 - L = 235 - SEZIONE TIPO D.1	45 g
48	Da Progr. 43+295 a Progr. 43+415 - L = 120 - SEZIONE TIPO D.1	25 g
49	Da Progr. 45+330 a Progr. 45+727 - L = 397 - SEZIONE TIPO D.2	60 g
50	Da Progr. 46+510 a Progr. 46+760 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2	210 g
51	**SPONDA SINISTRA**	**185 g**
52	Da Progr. 17+070 a progr. 17+225 - L = 155 - SEZIONE TIPO D.2	30 g
53	Da Progr. 34+380 a Progr. 34+640 - L = 260 - SEZIONE TIPO D.2	50 g
54	Da Progr. 35+005 a Progr. 35+155 - L = 150 - SEZIONE TIPO D.2	30 g
55	Da Progr. 40+320 a Progr. 40+405 - L = 105 - SEZIONE TIPO D.1	20 g
56	Da Progr. 43+190 a Progr. 43+270 - L = 80 - SEZIONE TIPO D.2	15 g
57	Da progr. 45+325 a progr. 45+575 - L = 250 - SEZIONE TIPO D.2	40 g
58	**INTERVENTI DI RIPROFILATURA DELL'ALVEO**	**700 g**
59	Interventi di riprofilatura dell'alveo	700 g
60	SMOBILIZZO AREE DI CANTIERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI	20 g
